

RELATÓRIO DE GESTÃO

OUTUBRO / 2020



INDICE:

A) Coordenação de Manutenção CMA/SOMA

1. Nota Explicativa;
2. Áreas e campus solicitantes junto à CMA no mês;
3. Principais disciplinas executadas por CMA;
4. Demonstrativo de ordens de serviço no mês;
5. Gráficos de ordens de serviço por área;
6. Gráfico de ordem de serviço por disciplinas;
7. Serviços Executados;
8. Relatório Fotográfico.

Coordenação de Manutenção - Superintendência de Operações e Manutenção - UFF.
Rua Prof. Marcos Waldemar Freitas Reis, s/n, bloco B - 5º andar.
Campus Universitário do Gragoatá, Niterói - RJ

B) Coordenação de Transporte, Segurança e Logística – CTSL/SOMA

9. Divisão de Transporte - DTR

18. Divisão de Segurança e Logística - DSL

A) COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO – CMA/SOMA**1. NOTA EXPLICATIVA - CMA**

- A relação dos serviços executados apresentada no item (7) abaixo demonstra com detalhes os serviços executados pelas equipes de Manutenção Predial.
- No entanto pode-se resumir que essas atividades são resultado da implantação dos contratos de serviços em vigor, inclusive o de Manutenção Predial recentemente implantado (09 de setembro de 2020).
- Esses contratos nos permitem o desenvolvimento das manutenção dos Chiller's, Equipamentos de Ar condicionado individuais, Manutenção das Subestações (essas sem esse serviço desde 1999 limitando-se apenas ao atendimento de situações emergenciais), esse enfoque dos serviços de manutenção visa principalmente a Preservação do patrimônio público sem a redução de sua vida útil, proporcionando menor consumo de energia entre outras vantagens.

2. ÁREAS E CAMPUS SOLICITANTES JUNTO À CMA NO MÊS**2.1 – NITERÓI**

- Campus Gragoatá;
- Campus Praia Vermelha;
- Campus Valonguinho;
- Reitoria;

- Áreas dispersas;
- Interior.

3. DISCIPLINAS EXECUTADAS

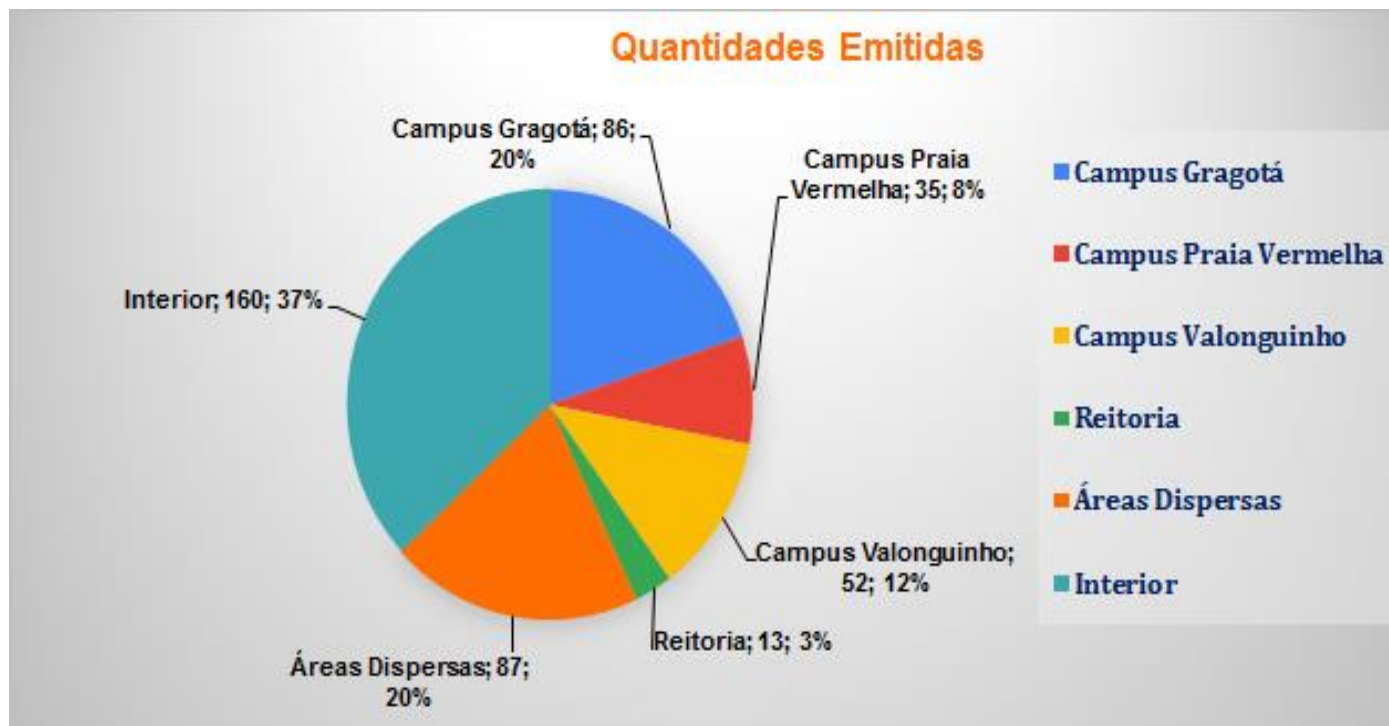
- Hidráulica (Desentupimento de ralo, troca de torneira, conserto de tubulação dentre outros);
- Elevadores (Manutenção preventiva e corretiva de elevadores);
- Elétrica (Troca de lâmpadas, conserto de exaustor, transferência dos circuitos dentre outros);
- Subestação – Elétrica (Manutenção preventiva e corretiva de subestações);
- Auxiliar de Almoxarife (Retirada de mobiliário, movimentação de materiais dentre outros);
- Auxiliar de Jardinagem (Poda de galhos, limpeza de calhas dentre outros);
- Marcenaria (Desmontagem de armário, instalação de porta);
- Limpeza de Reservatórios D'água (Limpeza dos reservatórios de água);
- Civil (Demolição de canteiro de obras, retirada do piso; troca de telhas dentre outros);
- Refrigeração (Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado);
- Pintura (pintura de paredes, pintura de portões dentre outros);
- Dedetização/Descupinização (Dedetização, descupinização e monitoramento de pragas);
- Serralheria (Confecção de cantoneira, conserto de travas dentre outros);
- Outros (Reforma das sinalizações do estacionamento dentre outros).

4. DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇO NO MÊS

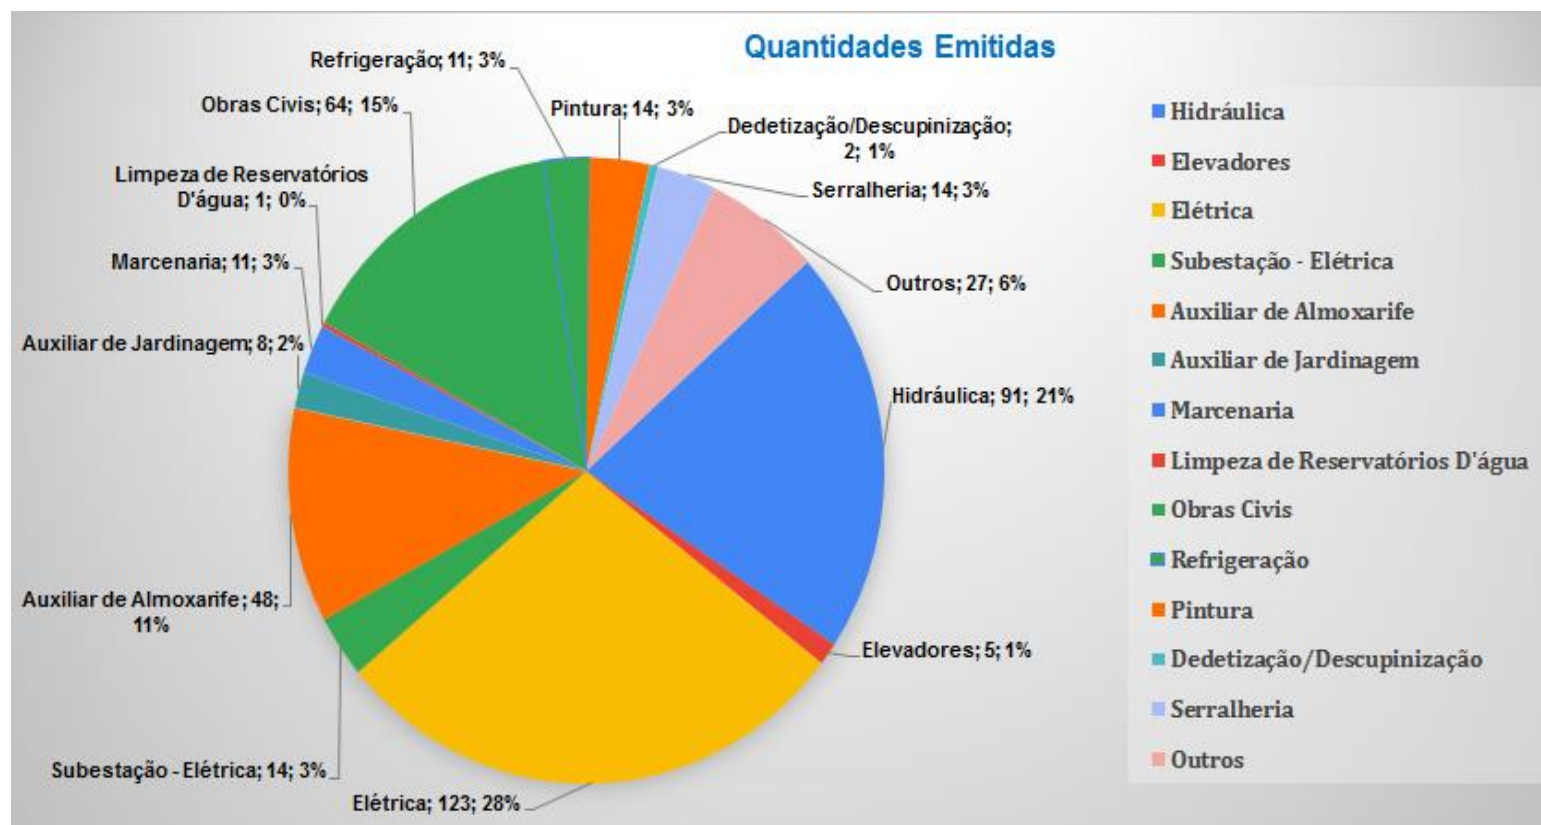
2020

TOTAL (OS EMITIDAS)	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
433	(Qt)	431	2
	(%)	100%	0%

5. GRÁFICO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) EMITIDAS POR ÁREA




6. GRÁFICO DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) EMITIDAS POR DISCIPLINA



7. SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS - PREDIAL							
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
1	01/10/2020	Demolição do Canteiro de Obras do prédio da Farmácia	Civil	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Josino, Wellington e Carlos
2	01/10/2020	Retirada da entrada de ar da bomba da casa de Maquinas.	Hidráulica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Renato Pessoa Dias
3	01/10/2020	Revisão Elétrica de todos os circuitos dos Postes de iluminação do campus	Hidráulica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Lucas Faria
4	01/10/2020	Troca de um Spud no vaso sanitário do banheiro unives do 1º andar	Hidráulica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Nilcinei Moraes
5	01/10/2020	Retirada de Entulho no 5º andar da Fac. Nutrição	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Ualace da Silva Carvalho
6	01/10/2020	Término da Confeção de uma Rampa de Acessibilidade em frente ao Banco do Brasil	Civil	Reitoria	Sim		Equipe: Felipe, Wellington e Carlos
7	01/10/2020	Confeção de Dreno do ar condicionado da sala do STI, 5º andar.	Hidráulica	Reitoria	Sim		Equipe: Vandelei e Felipe
8	01/10/2020	Desentupimento de um ralo no Laboratório 527 do 5º andar	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benido Furtunato da Silva
9	01/10/2020	Retirada de uma Válvula de pia no Laboratório 311 do 3º andar	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benido Furtunato da Silva
10	01/10/2020	Instalação Elétrica do ar condicionado da sala do STI, 5º andar	Elétrica	Reitoria	Sim		Equipe: Renata, Jefferson e Felipe
11	02/10/2020	Verificação e correção de todo o circuito de iluminação dos postes, Jardins, Pilotes e Marqueses dos Prédios	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens, Lucas e Felipe

12	02/10/2020	Verificação e correção de todo o circuito de iluminação dos postes, Jardins, Pilotes e Marquises dos Prédios	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo, Thiago e Josino
13	02/10/2020	Pintura do portão de acesso do Campus	Pintura	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Felipe, Reginaldo e Vinicius
14	02/10/2020	Retóques de Pintura na Parede Externa do Restaurante Universitário Gragoatá	Pintura	Gragoatá	Sim		Equipe: Abedias e Carlos
15	02/10/2020	Correção Elétrica com troca de lâmpadas na Placa de apresentação do Campus.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago
16	02/10/2020	Instalação de Vidro na Placa de apresentação do Campus	Marcenaria	Gragoatá	Sim		Equipe Jefferson e Jonatas
17	02/10/2020	Conserto de uma caixa Acoplada ao vaso sanitário do banheiro	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benido Furtunato
18	02/10/2020	Retirada de uma vazamento na bomba de recalque da casa de bomba do Instituto Biomédico	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benido Furtunato
19	02/10/2020	Limpeza do Telhado do DST	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio e Jonatas
20	05/10/2020	Retirada de Reboco que estava caindo e reparo no local com um novo reboco, na parede externa da sala 1 e 2 de Recuperação de Animais.	Civil	Veterinária	Sim		Equipe: Wellington, Carlos e Felipe
21	05/10/2020	Reposição de azulejos no banheiro Masculino do 3º andar do bl.E	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador e Ricardo
22	05/10/2020	Reposição de azulejos no banheiro Feminino do 2º andar do bl.E	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador e Ricardo
23	05/10/2020	Ajuste dos Parafusos do vaso sanitário e troca de válvula de descarga e uma bolsa pl o tubo ao vaso, banheiro Feminino do 2º andar	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo, Vinicius e Ricardo

24	05/10/2020	Trocas de 4 Lâmpadas e 4 bocais nos Postinhos do Bl. M	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe : Pablo, sob a fiscalização do Sr. Reis
25	05/10/2020	Troca de 3 Lâmpadas e 2 bocais nos Postinhos da BCG	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe : Pablo
26	05/10/2020	Desentupimento de Ralo do Box do banheiro Feminino do Térreo do bl. B	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo, Vinicius e Ricardo
27	05/10/2020	Pintura da Placa do Mapa situado na entrada do Campus	Pintura	Gragoatá	Sim		Equipe: Abedias , Reginaldo e Felipe
28	05/10/2020	Verificação da Tensão e troca de uma Luminária no 2º andar da Geociências	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
29	05/10/2020	Visita Técnica para verificação do Disjuntor na BCG. Constatou-se que necessita da Troca do mesmo.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato e Felipe
30	06/10/2020	Verificação da Tensão de uma tomada de bebedouro do 3º andar do Prédio da sala de aula	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
31	06/10/2020	Instalação de bebedoiro de no Hall dos Elevadores no Térreo	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
32	06/10/2020	Conserto de Circuito de iluminação em todos os Postes de Jardins do Campus	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe : Thiago

33	06/10/2020	Demolição do Barracão do Obra do Prédio da Farmácia	Civil	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Carlos Henrique
34	06/10/2020	Ligação elétrica e hidráulica de 2 bombas na casa da bomba, retirada da bomba que estava no local e levada para o gragoatá a mesma será instalada no bloco C do Gragoatá, seu local de origem.	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Oscar, Jorge, Marcelo, Ualace,
35	06/10/2020	Fechamento em volta do ar condicionado com EUCATEX na sala do STI	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio
36	06/10/2020	Vistoria Técnica para melhoria da instalação elétrica dos Postes no Estacionamento da Administração I.	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Thiago
37	06/10/2020	Retirada de Reboco podre no as paredes das salas 1 e 2 da Reprodução de Animais da Fac. de Veterinária	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Wellington
38	06/10/2020	Instalação de 2 luminárias de embutir na recepção da Clínica Médica da Reitoria	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Jorge
39	06/10/2020	Recolocação de Azulejos no banheiro do 2º andar do Bl. E	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador
40	06/10/2020	Fechamento da Tubulação da válvula de descarga com emboço e recolocação dos azulejos no 3º andar do Bl. B	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador
41	06/10/2020	Troca de 2 Toreneiras dos Lavatórios do bl. M	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Oscar
42	06/10/2020	Abastecimento e retirada da entrada de ar na bomba do Prédio da Física Velha	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
43	07/10/2020	Troca de uma bóia na caixa d'água na Fac. Direito II	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Benildo
44	07/10/2020	Troca de válvula de pia no Laboratório 312 do 3º andar do Instituto Biomédico	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
45	07/10/2020	Troca de uma Sifão de Laboratório no 312 do 3º andar do inst	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo

46	07/10/2020	Instalação completa de uma porta na sala da Empresa Rio Minas	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Jefferson
47	07/10/2020	Desentupimento de 1 ralo na sala 517 do Instituto Biomédico	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
48	07/10/2020	Desentupimento de 1 ralo na sala 527 do Instituto Biomédico	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
49	07/10/2020	Instalação de 2 cubas no banheiro masculino do 3º andar do Instituto de Química	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
50	07/10/2020	Troca de 1 bóia na caixa d'água do Campus da Fac. Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Benildo
51	07/10/2020	Troca de 1 válvula americana e 1 sifão na sala 311 do bl. A do Instituto Biomédico	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
52	07/10/2020	Retirada de uma Divisória que estava infestada de Cumpins e foi instalada outra nova em seu lugar, na secretária bl. D	Serrelheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
53	07/10/2020	Reparo de Válvula de descarga do banheiro feminino do 2º andar do bl. B	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
54	07/10/2020	Troca e reparo da Válvula de descarga do banheiro feminino do 5º andar do bl. N	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
55	07/10/2020	Retirada do reboco ruim e confecção de 1 novo parede externa do Laboratório Reprodução de Animais Fac. Veterinária	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Wellington
56	07/10/2020 - 28/10/2020	Reparo das telhas estruturais e reparos do madeiramento do telhado da BCV	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio
57	07/10/2020	Instalação de uma bebedouro no Hall dos Elevadores no Prédio da Física	Hidráulica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Nilcinei
58	07/10/2020	Troca de 2 lâmpadas de LED no Galpão da Empresa Rio Minas ao lado da Biblioteca Central	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens




59	07/10/2020	Troca de 1 tomada dupla no Galpão da Empresa Rio Minias ao lado da Biblioteca Central	Eétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
60	07/10/2020	Troca de 2 tomadas machos no DML, o Galpão da Rio Mnaís ao lado da Biblioteca Central	Eétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
61	07/10/2020	Verificação de tensão e troca de Calha no D.A no Prédio da Geociências 2º andar	Eétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
62	07/10/2020	Verificação de tensão na tomada do bebedouro no 3º andar no Prédio da Caomputação	Eétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
63	07/10/2020	Retirada de uma divisória e posta outra em seu lugar, na secre	Serrelheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
64	07/10/2020	Instalação de 3 porta cadeados no armário feminino do 2º and	Serrelheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
65	08/10/2020	Retirada de metalon no telhado da biblioteca central do Va	Serrelheiro	Valonguinho	Sim		Equipe: Helder
66	08/10/2020	Conserto de uma válvula de descarga no banheiro da Fac. D	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Marcelo
67	08/10/2020	Instalação de uma fechadura e um porta cadeado na porta do almoxarifado da Rio Minas	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Jefferson
68	08/10/2020	Troca de 2 carrapetas na biblioteca central.	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
70	08/10/2020	Feito um rebaixamento do teto no escritório da Empresa Ar	Serrelheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
71	08/10/2020	Retirada do piso da sala ao lado da secretaria no Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Ualace
72	08/10/2020	Instalação de um poste no canteiro entre os blocos G e H.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Renato
73	08/10/2020	Retirada de resíduos de argamassa das paredes do banheiro masculino para recolocação de azulejos.	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador
74	08/10/2020	Retirada do piso da sala ao lado da secretaria no Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Salvador




75	08/10/2020	Retirada de resíduos de argamassa das paredes do banheiro masculino para nivelção do contra piso	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Salvador
76	09/10/2020	Preparação das parede para pintura no Almojarifado da Em	Pintura	Valonguinho	Sim		Equipe: Abedias
77	09/10/2020	Colocação de dez 10 lâmpadas de Led de 18w no laboratório	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Renato
78	09/10/2020	Desentupimento de um vaso sanitário no mequinho.	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Renato
79	09/10/2020	Conserto de exaustor no NAL.	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Renato
81	13/10/2020	Manobra d'agua para abastecer os prédios do Campus.	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
82	13/10/2020	Instalação de portas na Fac. de Odontologia	Marcenaria	Valonguinho	Sim		Equipe: Jefferson
83	13/10/2020	Troca de lâmpadas nas escadas dos blocos F, G e H.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Abedias
84	13/10/2020	Mudança da posição de tomadas no bloco E	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago
85	13/10/2020	Aplicação de solda em uma chapa de ferro na parte do tubo do poste de iluminação do pátio.	Serralheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
86	13/10/2020	Execução de um novo contrapiso sala ao lado da secretaria	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Salvador
87	14/10/2020	Conserto em uma fechadura da secretária.	Marcenaria	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago
88	14/10/2020	Troca de uma torneira de lavatório na copa da BCG	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
89	14/10/2020	Aplicação de um novo reboco nas paredes externas e internas dos laboratórios de reprodução animal da Fac. de Veterinária	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: wellington




90	14/10/2020	Troca de mais lâmpadas nas escadas dos blocos F, G e H	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago
91	14/10/2020	Aplicação de prime para assentamento de manta asfáltica aluminizada no telhado do prédio da Administração I	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio
92	14/10/2020	Conserto da trava da porta da BCG e conserto de um carrinho de carga	Serrelheiro	Gragoatá	Sim		Equipe: Helder
93	14/10/2020	Término do contra-piso da sala ao lado da secretária da Clínica Geriátrica no Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Salvador
94	14/10/2020	Desmonte de um armário no CEART	Marcenaria	Reitoria	Sim		Equipe: Carlos
95	14/10/2020	Troca de 2 lâmpadas e 2 luminárias no corredor do bloco H	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago
96	15/10/2020	Colocação de uma porta de ferro e colocação de outra no lugar, sala ao lado da secretaria do Mequinho	Serrelheiro	Área Dispersa	Sim		Equipe: Luiz Felipe
97	15/10/2020	Colocação de uma porta de ferro e colocação de outra no lugar, sala ao lado da secretaria do Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Salvador
98	16/10/2020	Troca de 10 lâmpadas de LED no corredor do prédio do térreo	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe:
99	16/10/2020	Troca da tubulação de incêndio na área externa próximo ao estacionamento bl. H	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
100	16/10/2020	Foi feito a troca de um reparo no banheiro feminino do 2º andar	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
101	16/10/2020	Foi feito um conserto na descarga do banheiro do 3º andar	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
102	16/10/2020	Fechamento do vão de porta em alvenaria e instalação de uma porta Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Salvador
103	16/10/2020 - 22/10/2020	Pintura do muro externo do Campus Mequinho	Pintura	Área Dispersa	Sim		Equipe: Abedias
104	16/10/2020	Aplicação de manta no Rufos e no telhado da administração I	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio


105	16/10/2020	Início da restauração do reboco do teto na sala anexo	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Wellington
106	13/10/2020	Troca de Disjuntor das bombas do Prédio 30	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Rogério, Ademar e Francisco/DMBI
107	13/10/2020 - 23/10/2020	Troca das Foto-celulas e das luminárias nos postes da área externa, com ajuda do Caminhão Munck	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
108	13/10/2020	Feito o cabeamento para ar condicionado do setor de Empreendedorismo/UFF	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Rogério, Ademar e Francisco/DMBI
110	20/10/2020	Término da aplicação de prime e da manta asfáltica no telhado do prédio da administração I, Antiga Matemática.	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Antonio
111	20/10/2020	Quebra do chão para identificação de uma tubulação para posterior troca, Fac. Veterinária	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Matheus
113	20/10/2020	Fechamento da alvenaria do vão de porta na segunda sala da secretária do Mequinho, confecção de um novo reboco na parede da mesma.	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Wellington
114	20/10/2020	Retirada de uma porta com o caixonete e desmonte de um tablado bl. D, sala 139	Serralheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe


115	20/10/2020	Troca de 8 lâmpadas de LED ao redor do prédio da Ge	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
116	20/10/2020	Manobra d'água para abastecer os prédios do Campus	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
117	20/10/2020	Desentupimento de um vaso sanitário no banheiro feminino do 3º andar do Instituto de Computação	Hidráulica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Nilcinei Moraes
118	21/10/2020	Verificação de lâmpadas queimadas e troca das mesmas na área externa do Prédio da Física	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Rubens
120	21/10/2020	Pintura dos corredores e das paredes dos laboratórios de reprodução animal na Fac. Veterinária	Pintura	Área Dispersa	Sim		Equipe: Reginaldo
121	21/10/2020	Reparo no sistema de Alarme da Obra da Química	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Regório, Ademar e Artur/SOMA
122	21/10/2020	Corte de dois vidros para uma janela no Mequinho.	Marcenaria	Área Dispersa	Sim		Equipe: Luiz Felipe
123	21/10/2020	Troca de um anel de cera no banheiro social do laboratório da Eco pesca na Biologia	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
125	22/10/2020	Retirada de todo o piso do laboratório no Instituto Biomédico bl. A	Civil	Valonguinho	Não		Equipe: Aldair
126	22/10/2020	Confecção de um circuito de tomada na sala 407D, bl.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
127	22/10/2020	Confecção de um circuito de tomada na sala 407C, bl.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
128	23/10/2020	Colocação de azulejos no setor da Reitoria	Civil	Reitoria	Sim		Equipe: Ctesa




129	22/10/2020	Confecção de um circuito de tomada na sala 408, bl. M	Elétrica	Gragostá	Sim		Equipe: Pablo
130	22/10/2020	Pintura dos corredores e das paredes dos laboratórios de reprodução animal na Fac. Veterinária	Pintura	Área Dispersa	Sim		Equipe: Reginaldo
131	22/10/2020	Segunda etapa da retirada de todos o pisos da sala do Instituto Biomédico bl. A	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Aldair
132	22/10/2020	Revisão hidráulica nos banheiros masculinos e femininos com reposições de 3 vasos sanitários e troca de 2 reparos de válvulas na Fac. Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Marcelo Ctesa e Sr. Ailton/SOMA, junto c/ a Administradora do prédio Renta
133	22/10/2020	Substituição de 1 vaso sanitário no vestiário da Rio Minas, área externa na Fac. de Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Marcelo Ctesa, sob supervisão do Sr. Ailton/SOMA

134	22/10/2020	Substituição de 1 vaso sanitário na casa do Zelador na Fac. de Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Marcelo, sob supervisão do Sr. Ailton/SOMA
135	22/10/2020	Troca da tubulação hidráulica da descarga do banheiro da casa do Zelador na Fac. de Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Marcelo
136	23/10/2020	Limpeza e desentupimento de uma caixa de passagem	Hidráulica	Reitoria	Sim		Equipe: Vanderlei
137	23/10/2020	Troca de 2 vidros da janela no corredor da secretária	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Antonio
138	23/10/2020	Desentupimento da tubulação do vaso sanitário do banheiro do vestiário da Educação Física.	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
139	23/10/2020	Troca de 2 telhas no telhado do bloco A.	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Antonio
140	23/10/2020	Troca de 6 telhas no telhado na Fac. Educação Física	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Juan
142	23/10/2020	Troca de lâmpadas e bocais nos postes de jardim do	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Pablo

143	23/10/2020	Troca de Lâmpadas nos prtes do Mazzini Bueno	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe Ctesa
144	23/10/2020	Pintura dos corredores e das paredes dos laboratórios de reprodução animal na Fac.	Pintura	Área Dispersa	Sim		Equipe: Reginaldo
145	23/10/2020	Abertura de um vão para instalação de um caissonete de ar condicionado no Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Wellington
146	23/10/2020	Conserto de um vazamento de água pela torneira na sala 213 do bl. E	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Alex
147	23/10/2020	Feita a regulagem do batente da porta de Blindex pelo Administrador Andre do prédio da Biologia. Ademair certificou o serviço.	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademair/DMBI
148	26/10/2020	Instalação de disjuntor, circuito e quadro para ligação de equipamento na sala 306. Faltando instalação de disjuntor para o quadro de dentro da sala e tomada. Bl. M	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
149	26/10/2020	Troca de 7 plugs de tomada na sala 522 do bl. M	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
150	26/10/2020	Conserto e reaperto dos disjuntores do quadro de bombas do bloco B.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Josino, Wellington e Carlos
151	26/10/2020	Término da pintura da sala do procurador	Pintura	Reitoria	Sim		Equipe: Reginaldo

152	27/10/2020 - 30/10/2020	Aplicação de cola para assentamento de piso, paviflex, na sala anexa a secretaria no Mequinho	Civil	Área Dispersa	Sim		Equipe: Wllington
153	27/10/2020	Retirada da entrada de ar na bomba de recalque do p	Hidráulica	Gragoatá	Sim		Equipe: Marcelo
154	27/10/2020	Confecção do circuito elétrico da bomba de recalque do prédio, para instalação bl. N	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago
155	27/10/2020	Pintura das paredes dos corredor dos andares 1º e 2º da Faculdade de de Veterinária	Pintura	Área Dispersa	Sim		Equipe: Carlos Vito
156	27/10/2020	Movimentação de 12 telhas para cima do telhado da	Civil	Valonguinho	Sim		Equipe: Salvador
157	27/10/2020 - 30/10/2020	Aplicação de prime e assentamento de manta asfáltica aluminizada na laje do prédio na BCG	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Antonio
158	27/10/2020	Conserto de uma fechadura na porta de entrada da sala do protocolo.	Serrelheiro	Reitoria	Sim		Equipe: Luiz Felipe
159	27/10/2020	Emassamento da parde do laboratório do professor Saulo do 5º andar bl. M	Pintura	Gragoatá	Sim		Equipe: Abedias
160	27/10/2020	Troca dos Conectores do ramal alimentador do Mazzini Bueno	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademir UFF/SOMA
161	27/10/2020	Manobra d'água para abastecimento dos prédios do	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
162	27/10/2020	Confecção de um circuito elétrico e passagem de fio para alimentar uma tomada na sala 306 do bl. M	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
163	28/10/2020	Confecção de uma tampa para o ralo em aço inox na sala 506 do Bloco M.	Serrelheiro	Gragoatá	Sim		Equipe: Helder
164	28/10/2020	Pintura das paredes do rol das escadas dos andares 1º e 2º da Faculdade de de Veterinária	Pintura	Área Dispersa	Sim		Equipe: Reginaldo
165	28/10/2020	Instalação elétrica de uma bomba na Fac. de Direito	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Oscar
166	28/10/2020	Instalação hidráulica de uma bomba na Fac. de Dere	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Jorge
167	28/10/2020	Troca da graxeta da bomba da Fac. de Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Oscar
168	28/10/2020	Conserto de uma tubulação hidráulica na basa dos guardas na Fac. de Direito I	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Oscar

170	28/10/2020	Troca de 4 lâmpadas e instalação de um bocal na área externa do Campus da Fac. de Direito I	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Jorge
171	28/10/2020	Troca de telhas no telhado do prédio anexo da biblioteca central do Valonguinho	Marcenaria	Valonguinho	Não		Equipe: Antonio
172	28/10/2020	Conserto dos circuitos elétricos dos postes na área externa, troca de lâmpadas queimadas	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
173	28/10/2020	limpeza das caixas de passagem no Campus	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo
175	29/10/2020	Confecção de duas tampas de concreto para a caixa d'água da BCG	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Salvador
178	29/10/2020	Fechamento da abertura no chão para passagem de tubulação na Fac. de Veterinária	Hidráulica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Juan Carlos
179	29/10/2020	Fechamento com um acrílico na janela da casa de máquinas do bloco H.	Serralheiro	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
180	29/10/2020	Fechamento de um vão na alvenaria da parede da sala	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Juan Carlos
181	29/10/2020	Desentupimento e troca do sifão da pia do laboratório de magnetismo do 1º andar, nº 105 na	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
182	29/10/2020	Manobra d'água para abastecer os prédios do Campus	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
183	29/10/2020	Troca de uma torneiras de tanque no 1º andar do pátio no Instituto de Biologia	Hidráulica	Valonguinho	Sim		Equipe: Benildo
187	30/10/2020	Instalação de uma fechadura.	Marcenaria	Reitoria	Sim		Equipe: Antonio
188	30/10/2020	Instalação de um refletor na marquise do prédio da Biblioteca.	Elétrico	Gragoatá	Sim		Equipe: Thiago

189	30/10/2020	Instalação de um quadro de Disjuntor novo no bl. M	Elétrico	Gragoatá	Sim		Equipe: Pablo e Ademar
190	30/10/2020	Confecção de uma cantoneira para instalação de um acrílico na casa de máquinas para sanar a entrada de água pelas persianas bl. H.	Serralheria	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Luiz Felipe
191	30/10/2020	Transferência dos Circuitos do Prédio da Biologia laboratório do Pr. Alexandre Rodrigues para bl. M	Elétrico	Gragoatá	<u>Sim</u>		Equipe: Thigo Otesa, Ademar, Francisco e Artur
192	30/10/2020	Colocação de uma placa de acrílico em uma visita para vedar provisoriamente uma placa que caiu.	Serralheiro	Valonguinho	Sim		Equipe: Ricardo
193	30/10/2020	Confecção de uma caixa para o registro de incêndio na área externa do prédio.	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Juan Carlos

SERVIÇOS EXECUTADOS - PLANTÃO MANUTENÇÃO							
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
134	03/10/2020 (Sábado)	Conserto do vazamento da pia do setor de Geriatria no Mequinho	Hidráulico	Área Dispersa	Sim		Equipe : Ctesa - Renato Dias e Milton Pontes - Informação dada pelo Porteiro Flábio Gomes.
135	03/10/2020 (Sábado)	Conserto de um vazamento na casa de bomba Mequinho	Hidráulico	Área Dispersa	Sim		Equipe : Marcelo Dias e Milton Pontes
136	03/10/2020 (Sábado)	Conserto do comando da bomba no bl. H	Elétrico	Gragoatá	Sim		Equipe : Marcelo Dias e Milton Pontes
137	03/10/2020 (Sábado)	Conserto com troca de disjuntor, tomada macho e tomada fêmea no segundo andar do bloco E.	Elétrico	Gragoatá	Sim		Equipe : Ctesa Renato e Milton Pontes
133	04/10/2020 (Domingo)	Conserto do cabo Elétrico Rompido na Moradia Estudantil	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Ademir UFF e Mauricio Ctesa
200	04/10/2020 (Domingo)	Conserto do corrimão do bl. D	Civil	Gragoatá	Sim		Equipe: Ctesa

2020

201	04/10/2020 (Domingo)	Conserto de três disjuntores do bl. D	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Ademair/DMB/SOMA
202	04/10/2020 (Domingo)	Substituição de 03 luminárias e reatores para LED no 3º andar do bl. F	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Ademair DMB/SOMA e Edir Ctesa
203	10/10/2020 (Sábado)	Instalação de relógio de Ponto no Mequinho	Elétrica	Área Dispersa	Sim		Equipe: Ctesa
SERVIÇOS EXECUTADOS CTESA - INTERIOR							
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
Retroativos ao Mês de Setembro							
204	01/09/2020	Substituição de uma tomada de 10 A na sala 117.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun

205	02/09/2020	Troca de um interruptor de uma seção na sala 09.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
206	08/09/2020	Troca de uma resistência no chuveiro do vestiário feminino.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
207	10/09/2020	Instalação de uma tomada de 10A, 127v na sala multi uso.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
208	10/09/2020	Troca de um disjuntor de 15A nos refletores da portaria.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
209	11/09/2020	Troca de um receptáculo de louça (bocal) na área externa do Campus.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
210	14/09/2020	Instalação de uma tomada de 127V para atender a um bebedouro na área externa do Campus.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
211	15/09/2020	Instalação de uma tomada para atender a um ventilador na sala 03.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
212	16/09/2020	Troca de um interruptor de uma seção na cozinha.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
213	17/09/2020	Instalação de uma tomada de 220V para atender a uma máquina de lavar roupas na lavanderia.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
214	18/09/2020	Reparo nos circuitos de iluminação dos postes externos de jardim do Campus.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
215	21/09/2020	Reparo nos circuitos de iluminação dos postes do pátio.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
216	22/09/2020	Troca de lâmpadas no corredor superior.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
217	23/09/2020	Instalação de uma tomada de 127V para atender a um impressora.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
218	24/09/2020	Troca de lâmpadas na biblioteca do Campus.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun
219	25/09/2020	Troca de lâmpadas na tenda do Campus.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Roberto Braun

220	28/09/2020	Instalação de uma tomada de 127V que atende a uma Tv, na sala superior 09.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
221	29/09/2020	Instalação de uma tomada de 127V para atender a um moden, na sala da informática.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
222	30/09/2020	Instalação de uma tomada para atender a um retroprojeto na sala 09.	Elétrica	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
223	02/09/2020	Retirada de mobiliário velho e entulhos do galpão.	Outros	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
224	02/09/2020	Troca de lâmpadas no corredor do bloco B	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento, Paulo Roberto De
225	03/09/2020	Recuperação de 2 cadeiras de auditórios no auditório C.	Outros	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
226	03/09/2020	Instalação hidráulica e elétrica da bomba que voltou do conserto.	Elétrica e hidráulica.	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Luis Sergio Da Silva, Anderson De Souza Nascimento
227	08/09/2020	Troca de uma conexão para retirada de um vazamento no pátio.	Hidráulica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Luis Sergio da Silva.
228	08/09/2020	Verificação e limpeza do telhado do bloco E.	Outros	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
229	09/09/2020	Verificação e limpeza do telhado do LAPEDHE.	Outros	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
230	10/09/2020	Troca de 04 lâmpadas na sala 101 do bloco C.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
231	14/09/2020	Realizado a reposição dos parafusos e reaperto de três bancos no pátio.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
232	14/09/2020	Troca de um disjuntor na copa do bloco C.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
233	15/09/2020	Instalação de um adaptador para colocação de uma mangueira.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Luis Sergio Da Silva.

234	15/09/2020	Troca e aperto de parafusos em 3 bancos no pátio.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
235	18/09/2020	Troca de lâmpadas na sala LHAPEED.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
236	21/09/2020	Troca de lâmpadas no corredor do bloco G.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
237	23/09/2020	Reparo em duas cadeiras no auditório.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
238	24/09/2020	Revisão e correção elétrica do circuito elétrico do letreiro.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
239	28/09/2020	Troca de lâmpadas que estavam queimadas na portaria.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
240	29/09/2020	Confecção de uma tampa de concreto para uma caixa de passagem no pátio.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes, Paulo Roberto De Almeida
241	30/09/2020	Troca de uma tomada na recepção do bloco A.	Elétrica	Campos de Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento.
242	02/09/2020 - 08/09/2020	Demarcação em tinta das vagas no estacionamento do Campus.	Pintura	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Jose Antenor Bongard, Sebastião Carlos Marcelina, Daniel Gonçalves Quintas.
243	10/09/2020 - 18/09/2020	Pintura da recepção da clinica da Odontologia.	Pintura	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Jose Antenor Bongard, Sebastião Carlos Marcelina, Daniel Gonçalves Quintas.
244	21/09/2020 - 24/09/2020	Remoção da estrutura de alvenaria no antigo porão.	Civil	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Jose Antenor Bongard, Sebastião Carlos Marcelina, Daniel Gonçalves Quintas.
245	29/09/2020 - 30/09/2020	Retirada de entulho da obra do vestiário.	Civil	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Jose Antenor Bongard, Sebastião Carlos Marcelina, Daniel Gonçalves Quintas.
246	11/09/2020	Montagem de cadeira nos auditórios.	Outros	Macaé	Sim		Equipe: Alexandre De Freitas Linhares, Lucas Soares Azevedo Da Silva, Jose Morim Moreira

247	18/09/2020	Conserto do piso que foi quebrado para desentupimento do encanamento.	Civil	Rio das Ostras	Sim	Equipe: Alexandre De Freitas Linhares, Lucas Soares Azevedo Da Silva
248	21/09/2020	Confecção de contrapiso na calçada de acesso.	Civil	Rio das Ostras	Sim	Equipe: Alexandre De Freitas Linhares, Lucas Soares Azevedo Da Silva
249	22/09/2020	Retirada de um vazamento na tubulação de água potável.	Civil	Rio das Ostras	Sim	Equipe: Alexandre De Freitas Linhares, Lucas Soares Azevedo Da Silva
250	16/09/2020	Manutenção e limpeza dos ralos das pias dos banheiros masculino e feminino do 2º andar do INFES.	Hidráulica	STA Pádua	Sim	Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
251	16/09/2020	Troca de uma lâmpada do 1º andar do INFES.	Elétrica	STA Pádua	Sim	Equipe: Carlos Alexandre Soares Do Nascimento , Jose Ronaldo Gomes Chiapim
252	17/09/2020	Manutenção e limpeza dos ralos das pias dos banheiros masculino e feminino do 2º andar do INFES.	Hidráulica	STA Pádua	Sim	Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
253	17/09/2020	Troca de lâmpada do 2º andar do INFES.	Elétrica	STA Pádua	Sim	Equipe: Carlos Alexandre Soares Do Nascimento , Jose Ronaldo Gomes Chiapim
254	18/09/2020	Manutenção e limpeza dos ralos das pias dos banheiros masculino e feminino do 2º andar do INFES.	Hidráulica	STA Pádua	Sim	Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
255	18/09/2020	Troca de lâmpadas no corredor do térreo do INFES.	Elétrica	STA Pádua	Sim	Equipe: Carlos Alexandre Soares Do Nascimento , Jose Ronaldo Gomes Chiapim
256	21/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim	Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
257	21/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim	Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
258	22/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim	Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim

259	22/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Carlos Alexandre Soares Do Nascimento , Jose Ronaldo Gomes Chiapim
260	23/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
261	23/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
262	24/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
263	24/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
264	25/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
265	25/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
266	28/09/2020	Limpeza das calhas do INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
267	22/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Carlos Alexandre Soares Do Nascimento , Jose Ronaldo Gomes Chiapim
268	29/09/2020	Manutenção nas válvulas de descarga na biblioteca.	Hidráulica	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
269	30/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Jamerson Vieira Blanc, Jose Ronaldo Gomes Chiapim
270	30/09/2020	Manutenção do portão nº 2 no INFES.	Outros	STA Pádua	Sim		Equipe: Carlos Alexandre Soares Do Nascimento , Jose Ronaldo Gomes Chiapim

271	08/09/2020	Revisão hidráulica em 61 torneiras nos blocos A, B e C.	Hidráulica	Volta Redonda	Sim		Equipe: Jose Simeao
272	21/09/2020	Carregamento de bloquetes para o galpão.	Civil	Volta Redonda	Sim		Equipe: Ivanildo Correa, Claudio De Araujo Belo
273	23/09/2020	Limpeza das calhas do telhado dos prédio.	Civil	Volta Redonda	Sim		Equipe: Jose Simeao, Ivanildo Correa, Claudio De Araujo Belo, Alef Julio Augusto Oliveira
274	28/09/2020	Retirada de entulho do telhado.	Civil	Volta Redonda	Sim		Equipe: Jose Simeao, Ivanildo Correa, Claudio De Araujo Belo, Alef Julio Augusto Oliveira
275	28/09/2020	Revisão hidráulica e levantamento de material para troca de 20 torneiras.	Hidráulica	Volta Redonda	Sim		Equipe: Jose Simeao, Ivanildo Correa
276	29/09/2020	Retirada de entulho no pátio.	Civil	Volta Redonda	Sim		Equipe: Jose Simeao, Ivanildo Correa
Serviços Executados do Mês de Outubro							
278	13/10/2020	Aperto dos parafusos dos disjuntores do quadro elétrico.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
279	14/10/2020	Instalação de um circuito de tomada para atender a um retroprojeto.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
280	15/10/2020	Troca do disjuntor geral de iluminação do vestiário.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
281	16/10/2020	Troca de um interruptor no vestiário masculino.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
282	20/10/2020	Desligamento de um circuito elétrico e retirada do cabiamento.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
283	21/10/2020	Instalação de uma tomada na portaria do Campus.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun

284	22/10/2020	Foi solicitado a verificação do circuito de iluminação, foi constatado um rompimento do cabo na caixa de passagem, o mesmo foi consertado.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
285	23/10/2020	Troca de um interruptor na sala multiuso.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
286	26/10/2020	Troca de toda a fiação do circuito de iluminação dos refletores.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
287	27/10/2020	Desmonte dos circuito elétricos para serem aproveitados no bloco II.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
288	28/10/2020	Desmonte dos circuito elétricos para serem aproveitados no bloco II.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
289	29/10/2020	Desmonte dos circuito elétricos para serem aproveitados no bloco II.	Elétrico	Angra dos Reis	Sim		Equipe: Noberto Braun
290	9/10/2020	Retirada do vazamento do sifão do lavatório do banheiro masculino do 2º andar. IHS	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
291	9/10/2020	Troca de um sifão na pia de lavatório do banheiro masculino do 2º andar. IHS	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
292	9/10/2020	Retirada do vazamento do sifão do lavatório do banheiro feminino do 2º andar. IHS	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
293	9/10/2020	Regulagem da bóia da caixa acoplada do banheiro feminino do 2º andar. IHS	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
294	9/10/2020	Troca de um anel de vedação. SPA	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
295	9/10/2020	Manobra d'água para abastecimento dos prédios. SPA	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
296	9/10/2020	Fechamento de buraco que foi feito para tirar o vazamento de cano de água que vem de calha.	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
297	9/10/2020	Troca de um acionador da descarga acoplada ao vaso sanitário. IHS	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas

298	13/10/2020	Troca de um niple no banheiro da área externa do ICT.	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
299	13/10/2020	Recolocação de um armário do IHS.	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
300	16/10/2020	Recolhendo materiais pra dar início da obra. Serviço solicitado retirar o gradeamento de madeira que esta podre e fechar de alvenaria.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
301	20/10/2020	Início da fixação dos tubos para coleta de água do dreno do ar condicionado.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
302	20/10/2020	Início do fechamento do vão que esta aberto no muro na parte da frente do IHS.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
303	20/10/2020	Reparo na bóia da caixa acoplada ao vaso sanitário.	Hidráulico	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
304	21/10/2020	Continuação da fixação dos tubos para coleta de água do dreno do ar condicionado.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
305	23/10/2020	Início de rampa de acesso para contêiner 15 e16.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
306	23/10/2020	Término do fechamento do vão que esta aberto no muro na parte da frente do IHS.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
307	23/10/2020	Foi emboçado o vão no muro.	Civil	Rio das Ostras	Sim		Equipe: José Morim e Alexandre de Freitas
308	5/10/2020	Fixação dos quadros de distribuição interna e externa do prédio.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
309	6/10/2020	Passagem de cabos do quadro externo para o interno do prédio.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
310	8/10/2020	Troca de uma caixa de descarga no banheiro masculino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
311	8/10/2020	Troca de assentos sanitários no banheiro feminino e no masculino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves

312	8/10/2020	Instalação de tubulação de entrada e saída nas caixas de descarga no banheiro feminino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
313	8/10/2020	Instalação e troca de sifões nos banheiros masculinos e feminino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
314	8/10/2020	Instalação de tubulação de entrada e saída nas caixas de descarga no banheiro masculino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
315	8/10/2020	Troca de assentos sanitários no banheiro feminino e no masculino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
316	9/10/2020	Instalação de uma cuba de lavatório no banheiro masculino.	Civil	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
317	8/10/2020	Instalação de dois assentos sanitário no vestiário feminino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
318	13/10/2020	Manutenção das sinalizações do pátio do Campus.	Civil	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
319	13/10/2020	Montagem de prateleiras no almoxarifado.	Civil	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
320	13/10/2020	Troca de um vidro quebrado na janela da sala de informática.	Outros	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor e Daniel Gonçalves
321	14/10/2020	Instalação de três tomadas na sala do setor de limpeza.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
322	20/10/2020	Troca de um rabicho no banheiro masculino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
323	20/10/2020	Instalação de um sifão na pia do banheiro masculino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
324	20/10/2020	Troca de um alongamento da torneira do laboratório de análise de materiais.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
325	21/10/2020	Troca de lâmpadas no laboratório de análise de materiais.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva

326	22/10/2020	Reforma das sinalizações do estacionamento do C.	Outros	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
327	26/10/2020	Desentupimento de uma tubulação da pia do banheiro feminino.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor e Daniel Gonçalves
328	26/10/2020	Instalação de uma calha adesiva no vidro da porta do laboratório.	Outros	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor e Daniel Gonçalves
329	29/10/2020	Reforma das sinalizações do estacionamento do C.	Outros	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor, Sebastião Carlos e Daniel Gonçalves
330	29/10/2020	Reparo do vazamento no banheiro masculino do anfiteatro.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: José Atenor
331	29/10/2020	Troca de um vidro quebrado na janela.	Outros	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Sebastião Carlos
332	29/10/2020	Troca da bóia da caixa d'água do pátio.	Hidráulico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
333	29/10/2020	Troca de lâmpadas no corredores e nas salas de aula.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
334	29/10/2020	Troca de lâmpadas na entrada do laboratório PECM.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
335	29/10/2020	Troca de 3 lâmpadas queimadas na entrada do laboratório pré-clínico.	Elétrico	Nova Friburgo	Sim		Equipe: Thiago Silva
336	1/10/2020	Levantamento de material para instalação de lavador.	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
337	1/10/2020	Reparo no disjuntor do QDL do prédio novo.	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
338	2/10/2020	Instalação elétrica de uma bomba de recalque.	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
339	13/10/2020	Instalação de uma rede para alimentar as geladeiras dos laboratórios, B37, B26, B28 E B29	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
340	15/10/2020	Instalação de um lavatório no hall de entrada do prédio novo.	Hidráulico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia

341	15/10/2020	Instalação de 2 eletrocalhas na área externa ao prédio.	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
342	16/10/2020	Desentupimento de 2 vasos sanitários no banheiro masculino.	Hidráulico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
343	20/10/2020	Fixação de mão francesa nas paredes e retirada de cabos no chão da laje.	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
344	21/10/2020	Retirada de refletor de cima da laje e retirada do cabeamento.	Elétrico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
345	22/10/2020	Limpeza das calhas do prédio anexo.	Outros	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Ivan Correia
346	23/10/2020	Instalação de uma saboneteira e uma papeleira na entrada da portaria.	Civil	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Claudio de Araujo e José Simeão
347	23/10/2020	Retirada de ar da bomba do sub-solo.	Hidráulico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Claudio de Araujo
348	27/10/2020	Troca do bico do bebedouro.	Hidráulico	Volta Redonda - Vila	Sim		Equipe: Claudio de Araujo
349	14/10/2020	Acompanhamento na limpeza da subestação.	Outros	Volta Redonda - Aterredo	Sim		Equipe: Ivan Correia e José Simeão
350	14/10/2020	Escavação perto da subestação para descobrir a tubulação da rede.	Outros	Volta Redonda - Aterredo	Sim		Equipe: Ivan Correia e José Simeão
	5/10/2020	Confecção de uma tampa de concreto de 80 x 80 e colocação da mesma no lugar da que o caminhão quebrou.	Civil	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes
	5/10/2020	Foi feita a troca das lâmpadas no corredor do 1º andar do bloco E.	Elétrico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento
	6/10/2020	Limpeza do telhado e de duas calhas.	Outros	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes
	9/10/2020	Conserto to ventilador de teto da portaria.	Elétrico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento
	13/10/2020	Troca de lâmpadas queimadas no corredor do 1º andar do bloco E.	Elétrico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento

15/10/2020	Troca de lâmpadas queimadas na guarita da rua 28 Março.	Elétrico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento
19/10/2020	Troca de lâmpadas queimadas no banheiro.	Elétrico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento
21/10/2020	Troca de peças hidráulica na tubulação do lavatório do banheiro.	Hidráulico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Luis Sergio Da Silva
23/10/2020	Troca de lâmpadas queimadas no corredor do 2º andar do bloco E.	Elétrico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Anderson De Souza Nascimento
22/10/2020	Manobra d'água para abastecer os prédios do Cam	Hidráulico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Luis Sergio Da Silva
26/10/2020	Limpeza do telhado e de suas calhas.	Outros	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Talvane De Oliveira Gomes
26/10/2020	Troca de uma caixa de descarga no banheiro mascu	Hidráulico	Compus dos Goytacazes	Sim		Equipe: Luis Sergio Da Silva

SERVIÇOS EXECUTADOS - SUBESTAÇÕES


Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
351	22/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Biblioteca Central da Engenharia – Campus da Praia Vermelha.	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
352	22/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Restaurante Universitário / DOA. - Campus da Praia Vermelha	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
353	22/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Campus Avançado do Mequinho.	Elétrica	Mequinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco

354	25/03/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Água-MAB - Campus da Praia Vermelha	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
355	25/03/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Laboratório de Documentação Ativa e Design Inteligente-ADD Labs - Campus da Praia Vermelha.	Elétrica	Praia Vermelha	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
356	25/03/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Escola de Enfermagem.	Elétrica	Enfermagem	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
357	23/09/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Coordenação de Arquivos da UFF (CAR).	Elétrica	Arquivo	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
358	01/10/2020	Manutenção Corretiva com substituição e regulagem de seccionadora do Bloco D - Campus do Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
359	06/10/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Faculdade de Direito – Campus I.	Elétrica	Direito I	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
360	06/10/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Faculdade de Direito – Campus II.	Elétrica	Direito II	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco

361	08/10/2020	Manutenção Corretiva com Substituição de Transformador da Subestação Simplificada do Campo de Futebol / Ed. Física - Campus do Gragoatá.	Elétrica	Gragoatá	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
362	14/10/2020	Manutenção Preventiva da Subestação da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda.	Elétrica	Vila	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
363	14/10/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto de Ciências Exatas – ICEx. Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS / Bairro Aterrado.	Elétrica	Aterrado	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco
364	23/10/2020	Manutenção Preventiva da Subestação do Instituto de Química	Elétrica	Valonguinho	Sim		Equipe: Ademar, Artur, Francisco




SERVIÇOS EXECUTADOS - DMBM

Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	CONCLUÍDO?	FOTOGRAFIA	RESPONSÁVEL
365	01/10/2020	Chegada de Materiais da Empresa Rio Minas	Auxiliar de Almoxarife	Reitoria	Sim		Equipe: SWAT
366	01/10/2020	Manutenção Corretiva e Preventiva do Chiller do bloco F já está parcialmente funcionando.	Refrigeração	Gragoatá	Sim		Equipe: DMBM Refrigeração
367	01/10/2020	Remoção de caixas de líquido do Almoxarifado Central para o Galpão do Transporte Mequinho	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
368	01/10/2020	Colocação de Cadeiras na parte interna do Instituto de Biologia	Auxiliar de Almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: SWAT
369	01/10/2020	Transporte de Materiais da empresa Rio Minas que estavam na Reitoria e foram para o Mequinho	Auxiliar de Almoxarife	Reitoria	Sim		Equipe: SWAT
370	01/10/2020	Retirada de Galhos	Auxiliar de Almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: SWAT

371	02/10/2020	Recarregamento de Materiais internos do bl. C para o bl. P	Auxiliar de Almozarife	Gragoatá	Sim		Equipe: S/WAT
372	03/10/2020	Manutenção do Elevador Social da Reitoria	Elevador	Área Dispersa	Sim		AT Elevadores sob a fiscalização da DMBM Refrigeração
373	02/10/2020	Movimentação interna de cadeiras dos bls. N e P	Auxiliar de Almozarife	Gragoatá	Sim		Equipe: S/WAT
374	03/10/2020	Mecânico de refrigeração iniciando a ligação dos CH	Refrigeração	Gragoatá	Sim		
375	04/10/2020	Manutenção do Elevador do bl. M	Elevador	Gragoatá	Sim		Equipe: AT Elevadores e DMBM/SOMA
376	04/10/2020	Manutenção do Chiller do bl. M	Refrigeração	Gragoatá	Sim		Equipe: Ctesa e Cloves DMBM
377	04/10/2020	Técnicos dos Elevadores realizando inspeção nos Elevadores do Bl. C	Elevador	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Epodonto sob a fiscalização da DMBM
378	03/10/2020	Manutenção dos Chillers dos bls. F, G, H	Refrigeração	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Epodonto com sua supervisão da DMBM

379	02/10/2020	Transporte de ar condicionado do STI	Auxiliar de Almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: SWAT
380	05/10/2020	A empresa Rizoma realizando Roçada em todos os Campins da UFF	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe: Rizoma
381	05/10/2020	Conserto do Exaustorno prédio do Biotério da Biolo	Refrigeração	Valonguinho	Sim		Equipe: DMBM/SOMA
382	05/10/2020	Movimentação de materiais de (Covid-19) para as unidades da UFF	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
383	06/10/2020	Movimentação de Carteiras do Instituto de Biologia no bl. M	Auxiliar de Almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: SWAT
384	06/10/2020	Movimentação e Distribuição de Materiais para kits (Covid-19) em todas as unidades da UFF.	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: Orbenk (Poda) e Swat para recolhimentos dos galhos, acompanhado pelo Adalberto.

385	07/10/2020	Poda de Galhos entre os prédios P e O	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe: Orbenk (Poda) e Swat para recolhimentos dos galhos, acompanhado pelo Adalberto.
386	07/10/2020	Conserto do ar condicionado do setor de Transporte Mequinho	Refrigeração	Area Dispersa	Sim		Equipe de Refrigeração DMBM/SOMA
387	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. Direito I	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
388	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. Direito II	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
389	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de Farmácia	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT



390	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de Veterinária	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
391	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. do IACS	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
392	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de Veterinária	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
393	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de Enfermagem	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
394	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de INEAC	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
395	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de Medicina	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
396	07/10/2020	Entrega de Kits (Covid-19) na Fac. de Saúde da Comunidade	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT

397	08/10/2020	Retirada de Galhos do Mequinho	Auxiliar de Almojarife	Area Dispersa	Sim		Equipe da EGS e S/WAT
398	09/10/2020	Verificação dos 03 poços, que não foram afetados pelo alagamento.	Elevador	Area Dispersa	Sim		
399	09/10/2020	Poço do Elevador do bl. G seco.	Elevador	Gragoatá	Sim		
400	09/10/2020	Transporte de ar condicionado do Almojarifado Central para a Fac. de Engenharia	Auxiliar de Almojarife	Praia Vermelha	Sim		Equipe: SWAT
401	09/10/2020	Serviços internos bl. F	Auxiliar de Almojarife	Gragoatá	Sim		Equipe: SWAT
402	09/10/2020	Transporte de Materiais para Angra dos Reis	Auxiliar de Almojarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
403	13/010/2020	Aplicação de Inseticida para Controle de Pulgas no porão da Reitoria	Auxiliar de Almojarife	Area Dispersa	Sim		Empresa Ambiental

404	13/10/2020	Descupinição do CEART Reitoria	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equip: Orbenk
405	13/10/2020	Serviço de Limpeza de Calhas do telhado do Mequinho (CASIC)	Auxiliar de Jardinagem	Area Dispersa	Sim		Equip: Orbenk
406	14/10/2020	Mudança de alunos Angra dos Reis	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
407	14/10/2020	Retirada de Forro e Madeira do Valonguinho para o Gragoatá	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
408	14/10/2020	Retirada de Galhos	Auxiliar de Almoxarife	Valonguinho	Sim		Equipe: SWAT
409	14/10/2020	Entrega de Materiais Permanentes nos setores do Patrimônio, Paria Vermelha e Gragoatá	Auxiliar de Almoxarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
410	14/10/2020	Retirada de Madeiras da Biblioteca Central do Gragoatá	Auxiliar de Almoxarife	Gragoatá	Sim		Equipe: SWAT

411	14/10/2020	Retirada de folhas do setor CRIAA Barreto	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
412	14/10/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Campis de Volta Redonda Vila	Refrigeração	Area Dispersa	Sim		Equipe: Epodonto com a fiscalização da DMBM/SOMA
413	16/10/2020	Entrega de Materiais de Consumo na Farmácia Unif	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
414	16/10/2020	Entrega de Materiais de Consumo na Fac. Odontol	Auxiliar de Almozarife	Valonguinho	Sim		Equipe: SWAT
415	16/10/2020	Entrega de Materiais de Consumo no Almozarifado	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
416	16/10/2020	Serviço interno de organização de Equipamento de Musculação na Fc. Educação Física	Auxiliar de Almozarife	Gragoatá	Sim		Equipe: SWAT

417	16/10/2020	Descupinização na Gráfica da Reitoria	Auxiliar de Almozarife	Area Dispersa	Sim		Equipe: SWAT sob a fiscalização do Adalberto DMBM
418	16/10/2020	Manutenção Corretiva e Preventiva dos aparelhos de ar condicionado de Volta Redonda Aterrado	Refrigeração	Area Dispersa	Sim		Equipe: Epodonto com a fiscalização da DMBM/SOMA
419	16/10/2020	Entrega de Máscaras Cirúrgicas e N 95, para o Instituto de Saúde Coletiva da UFF	Auxiliar de Almozarife	Área Dispersa	Sim		Equipe : SWAT
420	16/10/2020	Início do trabalho de Descupinização e monitoramento de Pragas no Campus de Angra dos Reis		Área Dispersa	Sim		Equipe: sob fiscalização do Humentto/DMBI
421	17/10/2020	Roçada na Orla perto da Moradia Estudantil, para maior visibilidade e segurança para os vigilantes poderem transitar no local	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Rizoma

422	20/10/2020	Início da Manutenção Preventiva do ar condicionado no setor da Reitoria	Refrigeração	Reitoria	Sim		Equipe: Empresa Epodonto, sob fiscalização Adalberto DMBM
423	22/10/2020	Poda de árvore sobre a sede da Fac. de Educação Física	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Rizoma
424	22/10/2020	Remoção de Galhos da Poda feita da Fac. Educação Física	Auxiliar de Almoxarifado	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Rio Minas
425	23/10/2020	Colocação de Banner da Agenda Acadêmica na parte interna do HUAP	Auxiliar de Almoxarifado	Área Dispersa	Sim		Equipe: SWAT
426	23/10/2020	Colocação de Banner da Agenda Acadêmica na Entrada Principal do campus	Auxiliar de Almoxarifado	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Rio Minas

427	23/10/2020	Colocação de Banner da Agenda Acadêmica na Parte externa do Mequienho	Auxiliar de Almoxarife	Área Dispersa	Sim		Equipe: Empresa Rio Minas
428	23/10/2020	Início do serviço de limpeza dos reservatórios de água do bl. A	Limpeza	Gragoatá	Sim		Equipe: Empresa Interágua sob a supervisão da Técnica de Segurança do trabalho Tatiane/SOMA
429	23/10/2020	Descupinização na PROAD e PROGEPE	Limpeza	Reitoria	Sim		Equipe: Empresa Ambiental, sob a fiscalização do Adalberto DMBM

430	23/10/2020	Remoção dos restantes dos Galhos na Fac. Educação Física	Auxiliar de Almoxarifado	Gragoatá	Sim		Equipe: SWAT Rio Mainas
431	23/10/2020	Entrega de Materiais do Almoxarifado para Instituto Geociências	Auxiliar de Almoxarifado	Praia Vermelha	Sim		Equipe: SWAT Rio Mainas, sob fiscalização do Adalberto
432	28/10/2020	Retirada de Galhoas e Folhas Mequinho	Auxiliar de Almoxarifado	Área Dispersa	Sim		Equipe: SWAT Rio Mainas, sob fiscalização do Adalberto
433	28/10/2020	Retirada de Galhoas e Folhas Fac. Educação Física	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe: Orbenk, sob fiscalização do Adalberto

434	28/10/2020	Início da Instalação de 03 Split na HUVET	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Supervisionado pelo Naval/DMBM e Clovis da Ctesa
435	29/10/2020	Poda de Galhos e Limpeza dos Jardins na Educação	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe : Orbenk, apoio da SWAT, sob fiscalização do Adalberto
436	30/10/2020	Término da Instalação de 03 Split na HUVET	Refrigeração	Área Dispersa	Sim		Equipe: Supervisionado pelo Naval/DMBM e Clovis da Ctesa
437	30/10/2020	Poda de Galhos na rampa e escadaria da BCG e retirada dos mesmos pelo Auliar de Almoxarife	Auxiliar de Jardinagem	Gragoatá	Sim		Equipe : Orbenk, apoio da SWAT, sob fiscalização do Adalberto

8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES



Dia 05/10/2020 – Troca de Lâmpadas e bocais de postes de jardim a frente do Bloco M, Instituto de Biologia, do Campus Gragoatá.



Dia 23/10/2020 – Troca das Fotocélulas e luminárias, com ajuda de Caminhão Munck, nos postes da área externa do Campus Praia Vermelha.

2020



Dia 23/10/2020 - Serviço de limpeza dos reservatórios d'água do bloco A do Campus Gragoatá.



Dia 27/10/2020 - Troca dos conectores do ramal alimentador do Mazzini Bueno no Campus Valonguinho.

2020



Dia 28/10/2020 - Substituição das telhas quebradas na Biblioteca Central do Valonguinho.



Dia 29/10/2020 - Manutenção preventiva da subestação do Instituto de Química no Campus Valonguinho.

2020



Dia 30/10/2020 - Poda de galhos na rampa e escadaria do BCG no Campus Gragoatá.



Dia 30/10/2020 - Instalação aparelhos de Ar-condicionado Split na HUVET na Faculdade de Veterinária.

B) COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, SEGURANÇA E LOGÍSTICA – CTSL/SOMA**9. Divisão de Transporte - DTR/CTSL**

- ✓ Implantação do contrato nº 36/2019 de apoio operacional na área de transporte pela empresa Orbenk;
- ✓ Suporte logístico às ações do Restaurante Universitário na distribuição de alimentos para as Moradias Estudantis;
- ✓ Apoio logístico às ações da PROAES, nas distribuição de EPI's e Chromebooks às unidades, em virtude do retorno às aulas;
- ✓ Apoio Logístico aos Almojarifados;
- ✓ Suporte ao CAIT Mazzine Bueno na retirada de medicamentos;
- ✓ Transporte de sacos de ração e ratos wistars para Fazenda Escola de Cachoeira de Macacu;
- ✓ Apoio na mudança de alojamentos dos alunos da moradia estudantil de Angra dos Reis;
- ✓ Diligência nas Zonas Eleitoras 68º e 133º de São Gonçalo para identificação dos condutores para as viaturas solicitadas para apoio às eleições;

- ✓ Apoio ao Instituto de Geociências na retirada de carga na Base de Abastecimento da Marinha;
- ✓ Treinamento da empresa Orbenk para os colaboradores do contrato nº 36/2020;
- ✓ Suporte às ações do STI;
- ✓ Fiscalização, in loco, do contrato 09/2019 na unidade de Iguaba Grande;
- ✓ Continuação do processo de aferição dos tacógrafos das viaturas;
- ✓ Fiscalização, in loco, do contrato 36/2020 de suporte operacional na área de Transporte em Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda;
- ✓ Apoio logístico ao projeto FRENTE UFF da Escola de Engenharia na entrega e retirada das máscaras Face Shields;
- ✓ Apoio à unidade ESR / Campos dos Goytacazes na logística ao Protocolo Central;
- ✓ Apoio logístico na retirada de EPI's no combate à pandemia da COVID-19, pela Escola de Engenharia;
- ✓ Suporte as ações da DCF com auxílio do TaxiGov;
- ✓ Apoio logístico ao Gabinete do Reitor;
- ✓ Manutenção geral e contínua das Viaturas.

A) REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Visita da equipe da DSL/CTSL em Iguaba Grande



- Visita dos Fiscais Técnicos Titular e Substituto ao Campus de Santo Antônio de Pádua



DIRETOR DE TRANSPORTE, NILO RIBEIRO, FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO, FELIPE MARTINS, DIRETOR DE TRANSPORTE SUBSTITUTO, ALEXANDRE MARTINS, MECANICO DE AUTOMOVEI, RAFAEL MAGALHAES, FISCAL SETORIAL DE SANTO ANTONO DE PÁDUA, BENÍCIO.

2020

- Visita dos Fiscais Técnicos Titular e Substituto ao Campus Volta Redonda



2020



- Treinamento dos Colaboradores da Empresa Orbenk



Coordenador da CTSL, Carlos Belmont em treinamento aos novos motoristas da Divisão de Transporte.

2020

- Manutenção Contínua dos Veículos Oficiais



10. DIVISÃO DE SEGURANÇA E LOGÍSTICA – DSL/CTSL

10.1- INFORMAÇÕES GERAIS:

Devido à pandemia do novo Corona vírus COVID-19, foi necessária a redução de funcionários de portaria e zeladoria nos campi em consonância com a instrução de serviço da universidade. Dessa forma foram mantidos os funcionários que atuam em turnos de 12 x 36 nas unidades que ficaram abertas, que necessitam de acesso esporádico, para os serviços essenciais de limpeza e conservação e para segurança do patrimônio.

Os serviços de vigilância da empresa Hércules foram mantidos em sua integralidade em virtude de seu caráter essencial de serviços de proteção e segurança do patrimônio da instituição.

10.2 - PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Autorização de entrada de pessoas nos campi;
- Controle de acesso de pessoas e veículos nos campi;
- Informações de intercorrências nos prédios, tais como: luzes acesas, portas e janelas abertas, falha nos alarmes, ar-condicionado ligados, entre outros;

- Apoio de porteiros e zeladores para serviços de limpeza programada;
- Apoio de porteiros e zeladores para serviços de manutenção programada de elevadores;
- Apoio de porteiros e zeladores para a CMA/SOMA na identificação de serviços de manutenção dos prédios;
- Implantação de mais 1 posto de vigilante diurno e noturno nos Campus do Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha;
- Visita ao Campus de Iguaba Grande para verificação de invasão nas propriedades da Universidade.

10.3 - QUANTITATIVO DE POSTOS DE VIGILANTES POR REGIÃO

Rótulos de Linha ▼	ARMADO	DESARMADO	TOTAL
INTERIOR	24	14	38
NITERÓI	44	14	58
TOTAL	68	28	96

10.4 - QUANTITATIVO DE POSTOS DE VIGILANTES POR FUNÇÃO

PREVISTO X REAL					
Contagem de CONDIÇÃO	Rótulos de Coluna ▾				
Rótulos de Linha ▾	ARMADO	DESARMADO	TOTAL	PREVISTO	SALDO
VIGILANTE NOTURNO 12X36	23	23	46	54	8
SUPERVISÃO DIURNO 12X36		2	2	2	0
SUPERVISÃO NOTURNO 12X36		2	2	2	0
VIGILANTE DIURNO 12x36	22		22	22	0
VIGILANTE MOTO DIURNO 12X36	12		12	12	0
VIGILANTE MOTO NOTURNO 12X36	11	1	12	12	0
TOTAL	68	28	96	104	8

10.5 - QUANTITATIVO DE POSTOS DE VIGILANTES POR CAMPI

Rótulos de Linha ▾	QUANTIDADE
ANGRA DOS REIS - IEAR	2
ANGRA DOS REIS - RETIRO	2
CAMPOS - CENTRO	4
CAMPOS - XV NOVENBRO	4
FAC. DIREITO	2
FAC. ENFERMAGEM	2
FAC. FARMÁCIA	2
FAC. VETERINÁRIA	2
FAZENDA ESCOLA VET.	4
GRAGOATÁ	14
IACS	4
IGUABA GRANDE	4
MACAÉ	4
MEQUINHO	4
PETRÓPOLIS	2
PRAIA VERMELHA	12
REITORIA	4
RIO DAS OSTRAS	4
STO ANTONIO DE PADUA	2
VALONGUINHO	12
VOLTA REDONDA	2
VOLTA REDONDA - ATERRADO	4
Total Geral	96
