

RELATÓRIO DE GESTÃO

Fevereiro 2021



SUMÁRIO

1. Coordenação de Manutenção – CMA/SOMA

1.1 Áreas e campus solicitantes junto à CMA no mês

1.2 Principais disciplinas executadas

1.3 Demonstrativo de ordens de serviço no mês

1.4 Gráficos de ordens de serviço por área

1.5 Gráfico de ordem de serviço por disciplinas

1.6 Serviços Executados

2. Coordenação de Transporte, Segurança e Logística – CTSL/SOMA

2.1 Divisão de Transporte – DTR

2.1.1 Solicitações de Transporte e Logística executadas

2.1.2 Registros Fotográficos da Divisão de Transporte

2.2 Divisão de Segurança e Logística – DSL

2.2.1 Principais ações

2.2.2 Quantitativo de postos de vigilantes por região

2.2.3 Quantitativo de postos de vigilantes por função

2.2.4 Quantitativo de postos de vigilantes por campi

1. Coordenação de Manutenção – CMA/SOMA

1.1 Áreas e campus solicitantes junto à CMA no mês

1.1.1 Niterói e Interior

- Campus Gragoatá;
- Campus Praia Vermelha;
- Campus Valonguinho;
- Reitoria;
- Áreas dispersas;
- Interior.

1.2 Principais disciplinas executadas


- Hidráulica (Instalação hidráulica das bombas, troca de torneira, troca dos anéis de borracha de pia dentre outros);
- Elétrica (Troca de lâmpadas, troca de interruptor, instalação do quadro com disjuntores dentre outros);
- Auxiliar de Almoxarife (Retirada de materiais inservíveis, apoio em mudanças dentre outros);
- Auxiliar de Jardinagem (Poda de galhos, Roçada dos matos dentre outros);
- Marcenaria (Instalação de porta, Conserto de estrutura de telhado dentre outros);
- Limpeza de Reservatórios D'água (Limpeza dos reservatórios de água);
- Civil (Demolição da casa de bombas, confecção de uma rampa, reparo em paredes dentre outros);
- Extintores (Manutenção preventiva e corretiva de extintores);
- Refrigeração (Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado);
- Pintura (Pintura de parede, cerca, pintura do meio fio dentre outros);
- Dedetização/Descupinização (Dedetização, descupinização e monitoramento de pragas);
- Serralheria (Conserto de solda dentre outros);

Outros (Limpeza de telhado, calhas e descidas d'água dentre outros).


1.3 Demonstrativo de ordens de serviço no mês

TOTAL (OS EMITIDAS)	DADOS	OS ATENDIDAS	OS PENDENTES
328	(Qt)	328	0
	(%)	100%	0%

1.4 Gráfico de ordens de serviço emitidas por área

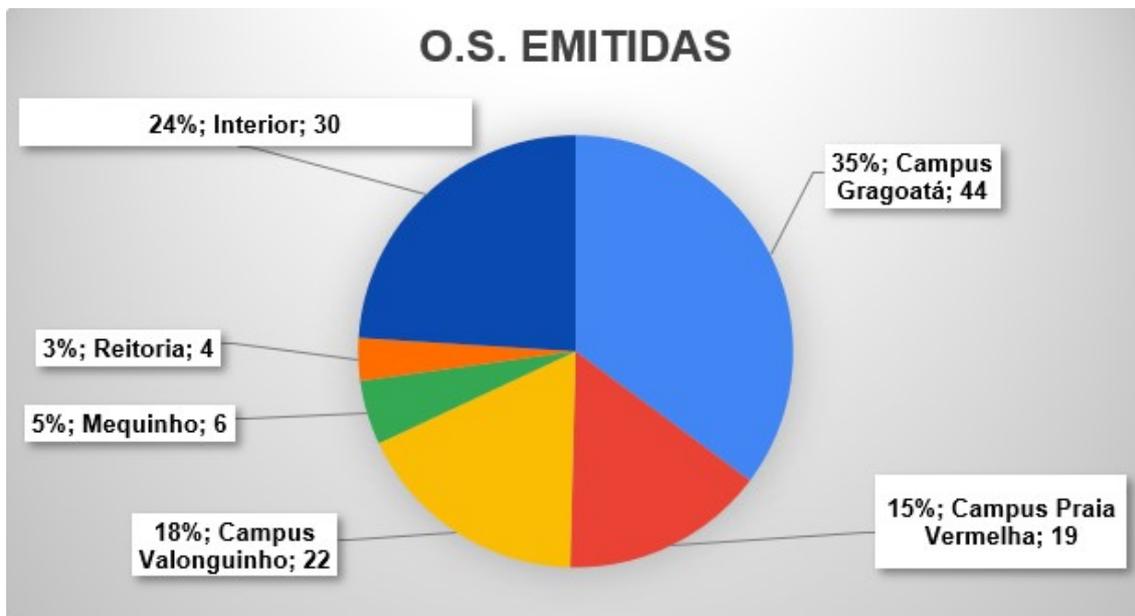

1.4 Gráfico de ordens de serviço emitidas por área

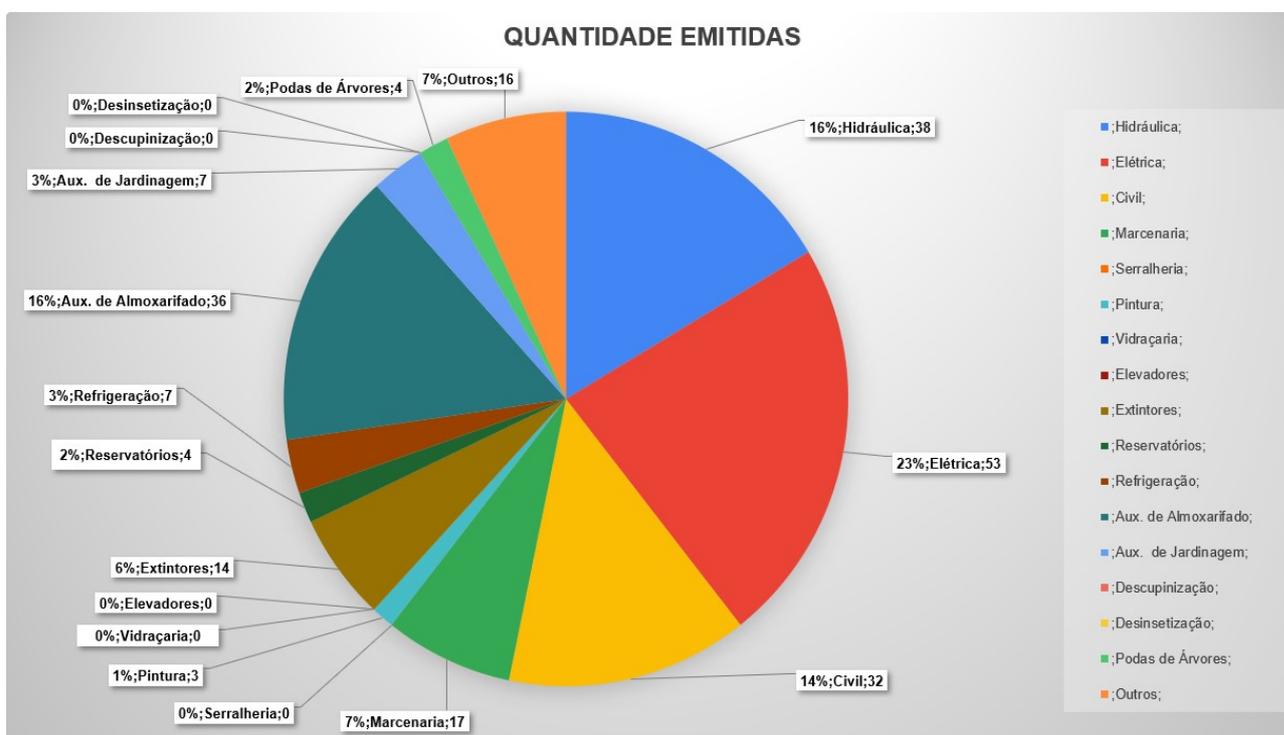

1.6 Serviços executados

DMBI - SERVIÇOS EXECUTADOS - NITERÓI						
Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	IMAGEM
1	01/02/2021	Vistoria e limpeza dos quadros de luz do prédio bl. A	Elétrica	Valonguinho	VL - Biomédico	-
2	01, 02, 03, 04/02/2021	Pintura das salas, portas de entrada, porta dos armários do 5º andar.	Pintura	Valonguinho	VL - Nutrição	-
3	01, 02, 03 e 23/02/2021	Pintura das grades do Valonguinho.	Pintura	Valonguinho	Área Externa	-
4	01/02/2021	Separação de telhas e madeiras para confecção de um tapume no ICAS	Outros	Praia Vermelha	Área Externa	-
5	01, 02/02/2021	Confecção de um novo contrapiso para o poço do elevador do bloco O.	Civil	Gragoatá	GR - História GR - Restaurante	-
6	01/02/2021	Troca de registros na tubulação que abastece o prédio bl. P	Hidráulica	Gragoatá	GR - Economia	-
7	01/02/2021	Troca de lâmpadas e vistoria no circuito de iluminação do prédio da Engenharia	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-

8	01/02/2021	Troca de um registro do chuveiro do banheiro dos guardas na Guarita do SDC - Oficina Jurujuba	Hidráulica	Unidades Dispersas	Arquivo	-
9	01/02/2021	Conserto de um reparo de descarga no banheiro de deficientes da copa do 1º andar.	Hidráulica	Unidades Dispersas	Arquivo	-
10	01/02/2021	Troca de uma tubulação de incêndio no prédio da Administração I	Hidráulica	Valonguinho	VL - Administração e Ciências Contábeis	-
11	01/02/2021	Troca de conexões e registro na casa de bombas na Educação física Gragoatá.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Educação Física	-
12	01/02/2021	Vistoria nas caixas d'água em cima da academia na Educação Física Gragoatá.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Educação Física	-
13	01/02/2021	Transporte de madeiramento e telhas galvanizada do Gragoatá para o IACS para confecção de tapume	Outros	Unidades Dispersas	IACS	-

14	01/02/2021	Concretagem do tubo de dreno no poço do elevador no bloco O Gragoatá.	Civil	Gragoatá	GR - História GR - Restaurante	-
15	02/02/2021	Rebaixamento de bancada no Bloco M sala 420.	Civil	Gragoatá	GR - Biologia	-
16	02/02/2021	Confecção de tapume para demolição de parte do muro no IACS I	Marcenaria	Gragoatá	IACS	-
17	02/02/2021	Acompanhamento de poda de árvores sobre a rede Elétrica no instituto de química Valonguinho.	Elétrica	Gragoatá	GR - UFASA - A	-
18	03/02/2021	Limpeza do telhado do Herbário no Valonguinho.	Civil	Valonguinho	Área Externa	-
19	03/02/2021	Bombas no subsolo do Prédio 30, com retirada de 3 bombas para reparo.	Elétrica	Valonguinho	VL - DCE	-

20	03/02/2021	Bombas no subsolo do Prédio 30, com retirada de 3 bombas para reparo.	Hidráulica	Valonguinho	VL - DCE	-
21	03/02/2021	Aplicação de prime na laje da casa de máquinas da Enfermagem.	Marcenaria	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
22	03/02/2021	Troca de um registro atrás do bloco O.	Hidráulica	Gragoatá	GR - ICHF	-
23	03/02/2021	Retirada de um vazamento de um tubulação que abastece a cisterna da Creche.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Creche	-
24	03/02/2021	Retirada de um curto circuito no disjuntor da bomba do laboratório de química situado no térreo.	Elétrica	Valonguinho	VL - Química	-
25	03/02/2021	Término do tapume para demolição do muro do IACS	Marcenaria	Unidades Dispersas	IACS	-

26	03/02/2021	Início da demolição de parte do muro no IACS (Ricardo, Rodrigo, Matheus, Nilmar e Fábio).	Civil	Unidades Dispersas	IACS	-
27	04/02/2021	Mudança da tubulação que abastece a caixa d'água do laboratório da Veterinária	Hidráulica	Unidades Dispersas	Veterinária	-
28	04/02/2021	Conserto de uma grade que será instalada em uma janela na sala 109 do bloco H.	Serralheria	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
29	04/02/2021	Abertura de uma vala para checagem de uma tubulação hidráulica que aparentemente está entupida, necessitará do caminhão vacool para desobstrução da rede.	Hidráulica	Gragoatá	GR - UFASA - A	-
30	04/02/2021	Verificação da tensão e da instalação da bomba da Arquitetura, constatou-se que a bomba está queimada.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
31	04/02/2021	Confecção do cordão no telhado da enfermagem.	Civil	Unidades Dispersas	Enfermagem	-

32	04/02/2021	Aplicação de manta na laje da casa de máquinas da enfermagem .	Civil	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
33	04/02/2021	Retirada da bomba que abastece o prédio do DCE para conserto.	Hidráulica	Valonguinho	VL - DCE	-
34	04/02/2021	Troca de interruptor na escada do térreo no bloco M.	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia	-
35	04/02/2021	Troca da tubulação da calha do telhado do bloco A.	Hidráulica	Valonguinho	VL - Biomédico	-
36	04, 12, 18 e 23/02/2021	Reforma das paredes da guarita do bloco A.	Civil	Valonguinho	VL - Biomédico	-
37	04/02/2021	Confecção de rufo do telhado da faculdade de enfermagem.	Civil	Unidades Dispersas	Enfermagem	-

38	04, 05/02/2021	Demolição do muro no IACS I	Civil	Unidades Dispersas	IACS	-
39	05/02/2021	Confecção da uma caixa para proteção do registro.	Civil	Gragoatá	GR - Biologia	-
40	05/02/2021	Instalação de 2 portas no térreo do bloco H.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
41	05/02/2021	Instalação de um caixonete e de uma porta na sala do térreo do bloco H.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
42	05/02/2021	Inspeção no sistema automático de bóia na Fac. de Veterinária	Elétrica	Unidades Dispersas	Veterinária	-
43	05/02/2021	Retirada de um vazamento do dreno do ar condicionado do Direito I.	Hidráulica	Unidades Dispersas	Direito	-

44	08/02/2021	Troca de sifão e rabicho na copa da faculdade de enfermagem.	Hidráulica	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
45	08/02/2021	Reparo no circuito elétrico do salão de entrada da faculdade de enfermagem, pois o mesmo encontrava-se sem energia.	Elétrica	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
46	08/02/2021	Confecção de suspiros nas tubulações das caixas d'água em cima da academia da educação física.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Educação Física	-
47	08/02/2021	Confecção de bypass para manobra de água em caso de entrada de ar na bomba da educação física Valonguinho (Marcelo).	Hidráulica	Gragoatá	GR - Educação Física	-
48	09/02/2021	Retirada das bombas do DCE e do prédio 30.	Outros	Valonguinho	VL - DCE	-
49	09/02/2021	Troca da tubulação da bomba da farmácia na casa das bombas	Hidráulica	Unidades Dispersas	Farmácia	-

50	09 e 10/02/2021	Aplicação de manta prime no junção do telhado da enfermagem com o muro do vizinho.	Outros	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
51	09/02/2021	Retirada da entrada de ar da bomba da cisterna da biblioteca central.	Hidráulica	Gragoatá	GR - BCG	-
52	09/02/2021	Verificação e reparo nas luminárias dos postes entre a moradia estudantil e a creche do Gragoatá.	Elétrica	Gragoatá	GR - Moradia Estudantil	-
53	09/02/2021	Instalação de portas no bloco H do Gragoatá.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
54	09/02/2021	Instalação de 1 fechadura e uma chave tetra na COSEAC, bloco C - Gragoatá.	Marcenaria	Gragoatá	GR - COSEAC	-
55	09/02/2021	Aplicação de protetor de armadura nas ferragens da Anatômico.	Civil	Valonguinho	VL - Biomédico	-

56	09/02/2021	Manobra d'água para abastecer os prédios do Campus, Valonguinho.	Hidráulica	Valonguinho	Área Externa	-
57	10/02/2021	Alteração de tomadas de refrigerador na sala 420 do Bl. M	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia	
58	10/02/2021	Fixação de 3 bicicletários na portaria do Campus.	Civil	Valonguinho	Área Externa	-
59	10/02/2021	Quebra do piso e sondagem para descobrir tubulação do ralo na entrada do auditório da faculdade de enfermagem.	Outros	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
60	10 e 12/02/2021	Segunda etapa da demolição de parte do muro no IACS I	Civil	Unidades Dispersas	IACS	-
61	10/02/2021	Confecção de uma rampa para facilitar a entrada e saída de veículos para vacinação contra o Covid-19	Marcenaria	Gragoatá	Área Externa	

62	10/02/2021	Vistoria de divisórias para reparo na Faculdade de Direito II.	Marcenaria	Unidades Dispersas	Direito	-
63	10/02/2021	Reforma da canaleta na entrada do Valonguinho.	Civil	Valonguinho	Área Externa	-
64	10/02/2021	Aplicação de prime e manta na laje da casa de máquina da Faculdade de Enfermagem.	Civil	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
65	10/02/2021	Instalação de um caps de 100mm para tamponamento do tubo que estava dando retorno d'água em frente ao auditório da faculdade de enfermagem .	Hidráulica	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
66	10 e 11/02/2021	Retirada do barrilete da caixa d'água do bloco E.	Civil	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	
67	10/02/2021	Troca de Lâmpadas e disjuntores bl. E	Elétrica	Valonguinho	VL - Biomédico	

68	10/02/2021	Ligação de um martele para um serviço de quebra dentro da cisterna do bloco E.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
69	11/02/2021	Limpeza do telhado e das calhas do alojamento dos guardas.	Outros	Praia Vermelha	Guarita	-
70	11/02/2021	Limpeza do telhado e das calhas da sala de aula ao lado do alojamento dos guardas.	Outros	Praia Vermelha	Guarita	-
71	12/02/2021	Instalação da Cadeira de acessibilidade para a piscina da Fac. de Educação Física	Elétrica	Gragoatá	GR - Educação Física	
72	12/02/2021	Aumento na altura do vão da porta para entrada da empilhadeira no almoxarifado do Mequinho.	Civil	Mequinho	MQ - Almoxarifado EDUFF	-
73	12/02/2021	Mudança de tomadas de local Bloco M sala 307.	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia	-

74	12 e 19/02/2021	Troca da tubulação e instalação de uma nova instalação hidráulica no barrilete da caixa d'água do bloco E, engenharia.	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
75	12 e 18/02/2021	Conserto da vala da calha de drenagem na entrada principal do Campus.	Civil	Valonguinho	Área Externa	-
76	18/02/2021	Retirada da parte de cima da divisória para passagem da empilhadeira no almoxarifado do Mequinho.	Marcenaria	Mequinho	MQ - Almoxarifado EDUFF	-
77	18/02/2021	Desmontagem do restante do palco da sala de imagem do Mequinho.	Marcenaria	Mequinho	MQ - Almoxarifado EDUFF	-
78	19/02/2021	Instalação elétrica e hidráulica de duas bombas uma no bloco H e outra no bloco A.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
79	19 e 22/02/2021	Instalação elétrica e hidráulica de duas bombas uma no bloco H e outra no bloco A.	Elétrica	Gragoatá	GR - UFASA - A	-

80	19/02/2021	Instalação de uma tomada 220V na sala do DCF, 5 andar na Reitoria.	Elétrica	Reitoria	RT - PROPLAN	-
81	19/02/2021	Manobra d'água para abastecimento da moradia estudantil do Gragoatá.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Moradia Estudantil	-
82	19 e 22/02/2021	Escavação de sapatas e retirada do entulho para confecção de parte do muro no IACS I	Civil	Unidades Dispersas	IACS	-
83	20/02/2021	Transporte com o auxílio da Pá Carregadeira dia paralelos do Bl. P para as Estufas. Onde serão calcetados dos pisos.	Outros	Gragoatá	Área Externa	-
84	20/02/2021	Impermeabilização da Junta de dilatação bl. D	Civil	Gragoatá		
85	20/02/2021	Limpeza da calha do telhado do bl. D	Outros	Gragoatá		

86	22/02/2021	Vistoria do palco no setor de transporte do Mequinho.	Marcenaria	Mequinho	MQ - Auditório	-
87	22/02/2021	Verificação do funcionamento do automático da farmácia universitária.	Elétrica	Unidades Dispersas	Farmácia	-
88	22/02/2021	Verificação do funcionamento do automático da farmácia universitária.	Hidráulica	Unidades Dispersas	Farmácia	-
89	22/02/2021	Troca de 2 luminárias na farmácia universitária.	Elétrica	Unidades Dispersas	Farmácia	-
90	22/02/2021	Mequinho, Verificação do telhado do CASIC, foi constatado que o mesmo precisa de uma limpeza para retirada do acúmulo de folhas que está causando o vazamento.	Marcenaria	Mequinho	MQ - CRASI	-
91	22/02/2021	Pintura do 3º andar da Reitoria.	Pintura	Reitoria	RT - PROPPi	-

92	22/02/2021	Retirada de um vazamento na sala 102 e 104 do bloco E, Praia vermelha.	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
93	23/02/2021	Jurujuba - troca do automático de bóia do campus.	Elétrica	Unidades Dispersas	Arquivo	-
94	23/02/2021	Fechamento de um vão na alvenaria para troca de uma tubulação do chuveiro.	Civil	Unidades Dispersas	Arquivo	-
95	23/02/2021	Limpeza das Calhas da Reitoria	Outros	Reitoria	Área Externa	
96	23/02/2021	Praia Vermelha - verificação e correção no circuito de iluminação da Geociências.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Geociências	-
97	23/02/2021	Troca de peças hidráulicas na tubulação da bomba, um TE se encontra rachado e quando liga se a bomba vaza muita água.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Restaurante	-

98	23/02/2021	Limpeza de calha e do telhado do bloco A.	Outros	Valonguinho	VL - Biomédico	-
99	24/02/2021	Luminária de DED instalada ao lado bl. E	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	
100	24/02/2021	Retirada de 3 bombas que estão queimadas para conserto.	Outros	Valonguinho	VL - Nutrição	-
101	24/02/2021	Confecção de uma forma para aplicação de grout para fixação dos tubos no fundo da caixa d'água do BLOCO E.	Civil	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
102	24/02/2021	Confecção da tubulação de limpeza da caixa d'água do bloco E.	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
103	24/02/2021	Quebra da parede passa passagem da tubulação de limpeza da caixa d'água do bloco E.	Civil	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-

104	24/02/2021	Troca da contatora e da bomba que abastece o prédio da Arquitetura.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Arquitetura e Urbanismo	-
105	24/02/2021	Retirada de uma bomba queimada e instalação hidráulica de uma bomba.	Hidráulica	Praia Vermelha	P.V - Arquitetura e Urbanismo	-
106	24/02/2021	Instalação do automático de bóia no reservatório superior e inferior do prédio.	Elétrica	Praia Vermelha	P.V - Arquitetura e Urbanismo	-
107	24/02/2021	Confecção de tendas em madeira para a vacinação contra a Covid 19.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
108	24/02/2021	Confecção de tendas em madeira para a vacinação contra a Covid 19.	Marcenaria	Gragoatá	GR - Matemática e estatística	-
109	24/02/2021	Manobra d'água para abastecer os prédios do Campus.	Hidráulica	Gragoatá	GR - Letras	-

110	24/02/2021	Retirada de bombas no prédio 30 do Valonguinho.	Hidráulica	Valonguinho	VL - Odontologia	-
111	24/02/2021	Instalação de uma caixa d'água e verificação do funcionamento da bomba que abastece o prédio.	Hidráulica	Unidades Dispersas	Veterinária	-
112	24/02/2021	Conserto da tubulação que abastece a estufa do Gragoatá.	Hidráulica	Gragoatá	Área Externa	-
113	24/02/2021	Vistoria e avaliação da elétrica do almoxarifado do Mequinho. Foram feitos alguns reparos porém necessita da visita de um engenheiro elétrico para conserto do quadro central e de todos os circuitos do quadro.	Elétrica	Mequinho	MQ - Almoxarifado EDUFF	-
114	25/02/2021	Aplicação de graute para chumbamento dos tubos de descida no bl. E	Civil	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	-
115	25/02/2021	Conserto da tampa da cisterna do bloco B.	Civil	Gragoatá	GR - Letras	-

116	25/02/2021	Retirada dos aparelhos de ar condicionado do restaurante do Gragoatá para o bloco P.	Civil	Gragoatá	GR - ICHF	-
117	25/02/2021	Aplicação de prime na marquise da entrada da Farmácia para aplicação de manta.	Civil	Unidades Dispersas	Farmácia	-
118	25 e 26/02/2021	Retirada de materias do bl. D	Outros	Gragoatá	GR - Educação	-
119	25/02/2021	Conserto de um Curto-Circuito no Cine Arte Reitoria	Elétrica	Reitoria	RT - Centro de Artes	
120	25/02/2021	Conserto de uma tomada do Switch que estava com mau contato na sala da Superintendência, 5º andar no bl. B	Elétrica	Gragoatá	GR - Letras	-
121	27/02/2021	Troca das Lâmpadas foram realizadas nos postes atrás do INEST, na frente da Biblioteca, na Ecopesca, em frente antigo Inst. de Biologia, Química, Restaurante do Jefferson e Labiomol.	Elétrica	Valonguinho	Área Externa	

DMBI - SERVIÇOS EXECUTADOS - INTERIOR

Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	CONCLUÍDO?
122	01/02/2021	Troca de cilindro da fechadura da porta do laboratório.	Outros	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
123	02/02/2021	Troca de um sifão da pia do banheiro feminino da recepção das clínicas.	Hidráulica	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
124	03/02/2021	Instalação de prateleiras na cozinha casarão	Outros	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
125	08/02/2021	Troca de lâmpadas no banheiro feminino das sala de aula.	Elétrica	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
126	08/02/2021	Troca da luminária do corredor de entrada.	Elétrica	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-

127	08/02/2021	Troca de lâmpada na portaria.	Elétrica	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
128	10/02/2021	Troca de 2 lâmpadas na luminária do pátio.	Elétrica	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
129	11/02/2021	Descarregamento de materiais para obra nas clínicas	Outros	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
130	22/02/2021	Reparo da rede de iluminação do pátio	Elétrica	Nova Friburgo	N.F - ISNF	-
131	10/02/2021	Vistoria do serviço de pintura das fachadas da unidade de Petrópolis	Pintura	Petrópolis	PT - Esc. de Engenharia	

132	19/02/2021	Reparo no ramal de ligação e restabelecimento da energia na Fazenda	Elétrica	Iguaba	Fazenda Escola	
133	19/02/2021	Instalação de 04 luminárias solares, sendo 03 na sede e uma próxima a Lagoa.	Elétrica	Iguaba	Fazenda Escola	
134	02/02/2021	Entrega da Obra de recuperação e pintura da fachada da Unidade de Petrópolis	Pintura	Petrópolis	PT - Esc. de Engenharia	
135	02/02/2021	Reparos de vazamento na pia do banheiro feminino do SPA	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - SPA	-
136	02/02/2021	Conserto do entupimento da pia da cozinha	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - ICT	

137	03/02/2021	Instalação de torneiras Automáticas na sala de Enfermagem	Pintura	Rio das Ostras	R.O - IHS	
138	05/02/2021	Troca de reparo da caixa de vaso sanitário	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS	
139	08/02/2021	Instalação de duas torneiras eletricas	Elétrica	Rio das Ostras	R.O - IHS	
140	08/02/2021	Adaptação de instalação hidráulicas para instalação das torneiras eletricas	Hidráulica	Rio das Ostras	R.O - IHS	-
141	08/02/2021	Reparo de porta do banheiro masculino	Marcenaria	Rio das Ostras	R.O - ICT	-

142	09/02/2021	Reparo da porta do Laboratório de Enfermagem	Marcenaria	Rio das Ostras	R.O - IHS	-
143	10/02/2021	Reparo do muro do ICT	Civil	Rio das Ostras	R.O - ICT	
144	11/02/2021	Reboco do muro nos fundos da Moradia	Civil	Rio das Ostras	R.O - Moradia Estudantil	
145	11/02/2021	Reparo no telhado da Moradia	Civil	Rio das Ostras	R.O - Moradia Estudantil	
146	22 e 26/02/2021	Instalação de pingadeira em Janela da sala de Coordenação	Civil	Rio das Ostras	R.O - ICT	-


147	02/02/2021	Reparo da Fotocélula para iluminação dos postes da rua principal	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
148	03 04/02/2021	Reparo e isolamento nos cabos eletricos da caixa de passagem de 220V no antigo bl. 1	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
149	05/02/2021	Trocar o Disjuntor de 25A das tomadas de 127V no Casarão	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
150	08/02/2021	Instalar uma tomada para ventilador de parede na portaria	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
151	10/02/2021	Troca do Disjuntor da Administração	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-

152	11/02/2021	Troca do interruptor no vestiário	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
153	12/02/2021	Instalação de tomadas para camera no Casarão	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
154	18/02/2021	Troca de Disjuntor na portaria principal	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
155	19/02/2021	Instalação de interruptor no refeitório	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
156	22/02/2021	Troca de Disjuntor na sala Multiuso	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-

157	23/02/2021	Troca de interruptor no banheiro	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
158	24/02/2021	Instalação de uma tomada de uma forma de Microondas na portaria	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-
159	25/02/2021	Retirada dos componentes eletrônicos do bl. 03 para reaproveitamento	Elétrica	Angra dos Reis	A.R - Retiro	-

SUBESTAÇÕES - SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	CONCLUÍDO?
160	02/02/2021	Inspeção da Subestação no Gragoatá bl. M	Elétrica	Gragoatá	GR - Biologia	
161	09/02/2021	Tensionando a rede de média tensão nos fundos do bl. P no Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	GR - ICHF	

162	09/02/2021	Manutenção Corretiva com Troca de Cruzetas da Ed. Física - Campus do Gragoatá	Elétrica	Gragoatá	Área Externa	
163	23/02/2021	Manutenção Preventiva das Subestações - plificadas do PURO - Rio das Ostras	Elétrica	Rio das Ostras	R.O - IHS	

DMBM - SERVIÇOS EXECUTADOS - NITERÓI

Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	CONCLUÍDO?
164	01/02/2021	Entrega de materiais patrimoniados do Mequinho para Praia Vermelha	Aux. de Almoxarifado	Praia Vermelha	P.V - Engenharia	
165	01/02/2021	Retirada de Caixa álcool do Almoxarifado Central do Mequinho para o COLUNI	Aux. de Almoxarifado	Gragoatá	COLUNI	
166	01/02/2021	Retirada de Caixa álcool do Almoxarifado Central do Mequinho para o Santo Antonio de Pádua	Aux. de Almoxarifado	Santo Antônio de Pádua	S.A.P - INFES	

167	01/02/2021	Retirada de Caixa álcool do Almoarifado Central do Mequinho para Campos dos Goytacazes	Aux. de Almoarifado	Campos dos Goytacazes	Geral	-
168	01/02/2021	Retirada de Caixa álcool do Almoarifado Central do Mequinho para Macaé	Aux. de Almoarifado	Unidades Dispersas	Geral	-
169	01/02/2021	Retirada de Caixa álcool do Almoarifado Central do Mequinho para Rio das Ostras	Aux. de Almoarifado	Unidades Dispersas	Geral	-
170	02 e 08/02/2021	Organização de materiais no Almoarifado (SOMA) do Gragoatá	Aux. de Almoarifado	Gragoatá	GR - SOMA	
171	02/02/2021	Retirada de entulho do porão da Fac. de Odontologia	Aux. de Almoarifado	Valonguinho	VL - Odontologia	
172	03/02/2021	Desobstrução da Rede de Esgoto da Praia Vermelha	Aux. de Almoarifado	Praia Vermelha	Área Externa	
173	03/02/2021	Transporte de Moirão de Cachoeiras de Macacu para Iguaba	Aux. de Almoarifado	Unidades Dispersas	Área Externa	

174	03/02/2021	Transporte de material da antiga Biologia Valonguinho para o bl. M Gragoatá	Aux. de Almojarifado	Gragoatá	GR - Biologia	
175	04/02/2021	Entrega de materiais patrimoniados do Mequinho para Antonio Pedro HUAP	Aux. de Almojarifado	Unidades Dispersas	Área Externa	
176	04/02/2021	Entrega de materiais patrimoniados do Mequinho para IACS I	Aux. de Almojarifado	Unidades Dispersas	IACS	
177	04/02/2021	Entrega de materiais patrimoniados do Mequinho para Fac. de Direito	Aux. de Almojarifado	Unidades Dispersas	Direito	
178	04/02/2021	Transporte de Latas de Tintas do Ufasa bl. H para Reitoria e Campus do Gragoatá	Aux. de Almojarifado	Unidades Dispersas	Área Externa	-
179	04 e 05/02/2021	Retira de entulho do Valonguinho	Aux. de Almojarifado	Valonguinho	Área Externa	
180	05/02/2021	Desobstrução da Rede de Esgoto da Reitoria	Aux. de Almojarifado	Reitoria	Área Externa	


181	05/02/2021	Mudança da sobre loja da Reitoria para o 5º andar	Aux. de Almoxarifado	Reitoria	RT - PROEX	
182	13/02/2021	Transporte de armário mesa e cadeira Biomédico para Morfologia	Aux. de Almoxarifado	Valonguinho	Área Externa	
183	13/02/2021	Retirada de Galhos da Fac. de Direito	Aux. de Almoxarifado	Unidades Dispersas	Área Externa	
184	20/02/2021	Retirada de Materiais do Almoxarifado Central do Mequinho para ser entregues no Campus da Praia Vermelha	Aux. de Almoxarifado	Praia Vermelha	Geral	-
185	20/02/2021	Retirada de Materiais do Almoxarifado Central do Mequinho para ser entregues no Campus do Gragoatá	Aux. de Almoxarifado	Gragoatá	Geral	
186	20/02/2021	Retirada de Materiais do Almoxarifado Central do Mequinho para ser entregues no Campus do Valonguinho	Aux. de Almoxarifado	Valonguinho	Geral	-
187	20/02/2021	Mudança interna no setor da PROAES	Aux. de Almoxarifado	Reitoria	RT - PROAES	-

188	20/02/2021	Retira de Sucatas no Campus do Gragoatá	Aux. de Almoxarifado	Gragoatá	Área Externa	
189	22/02/2021	Limpeza no Centro de Manutenção do bl. N	Aux. de Almoxarifado	Gragoatá	GR - Psicologia	
190	22/02/2021	Transporte de material de obra do Gragoatá para a Fac. de Direito II	Aux. de Almoxarifado	Unidades Dispersas	Direito	
191	22 e 23/02/2021	Limpeza, arrumação e manutenção da SOMA bl. N	Aux. de Almoxarifado	Gragoatá	GR - ICHF	
192	23/02/2021	Entrega de equipamentos e mobiliários Mequinho para Campus Gragoatá	Aux. de Almoxarifado	Gragoatá	GR - Letras	
193	23/02/2021	Entrega de equipamentos e mobiliários Mequinho para prédio Biomédico	Aux. de Almoxarifado	Valonguinho	VL - Biomédico	
194	23/02/2021	Retirada de sabão Líquido de Caminhão Scania para o Galpão do transporte Mequinho	Aux. de Almoxarifado	Mequinho	MQ - Almoxarifado PROAD	

195	25/02/2021	Serviço interno no NAL	Aux. de Almojarifado	Unidades Dispersas	VL - NAL	
196	25/02/2021	Retirada de ar condicionado e estufa da Biologia Antiga para o NAL	Aux. de Almojarifado	Valonguinho	VL - NAL	
197	25/02/2021	Retirada de ar condicionado e estufa da Biologia Antiga para o bl. M Gragoatá	Aux. de Almojarifado	Gragoatá	GR - Biologia	-
198	25/02/2021	Entrega de sabonetes líquidos do Mequinho para Coluni	Aux. de Almojarifado	Unidades Dispersas	COLUNI	-
199	25/02/2021	Entrega de sabonetes líquidos do Mequinho para o Campus do Gragoatá, Educação Física, Creche e Coseac	Aux. de Almojarifado	Gragoatá	Geral	
200	25/02/2021	Entrega de sabonetes líquidos do Mequinho para os bls. G, H, F, D e B	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Geral	

DMBM - SERVIÇOS REFRIGERAÇÃO - NITERÓI

201	02/02/2021	Conserto do Refrigerador do Inst. de Química	Refrigeração	Valonguinho	VL - Química	
202	02 e 03/02/2021	Manutenção de ar condicionado da COSEAC bl. C	Refrigeração	Gragoatá	GR - COSEAC	
203	05 e 08/02/2021	Retirada dos bebedouros do bl. H para consertos	Refrigeração	Gragoatá	GR - Matemática e estatística	
204	10/02/2021	Manutenção preventiva e Corretiva dos aparelhos de ares condicionados na Sobre Loja da Reitoria	Refrigeração	Reitoria		
205	10/02/2021	Manutenção preventiva e Corretiva dos aparelhos de ares condicionados no 1º andar da Reitoria	Refrigeração	Reitoria		
206	10/02/2021	Instalação de ar condicionados no Biotério do NAL	Refrigeração	Valonguinho	VL - NAL	
207	22/02/2021	Reparo no ar condicionado do STI sala segura	Refrigeração	Valonguinho	VL - STI	

208	01/02/2021	Podas de Árvores no Campus do Valonguinho	Podas de Árvores	Valonguinho	Área Externa	
209	02/02/2021	Remoção de galhos entre os Prédios da Biologia e Química	Aux. de Jardinagem	Valonguinho	Área Externa	
210	04/02/2021	Poda de galhos atrás e lateral do prédio da Física Velha	Aux. de Jardinagem	Valonguinho	VL - InEAC	
211	04/02/2021	Poda de galhos atrás e lateral do Inst. Biologia	Podas de Árvores	Valonguinho	Área Externa	
212	04/02/2021	Poda de galhos atrás e lateral do Inst. Química	Podas de Árvores	Valonguinho	VL - Química	-
213	05/02/2021	Limpeza de Jardinagem e Corete de gramas do entre os prédios F, G e H	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Área Externa	

214	08/02/2021	Poda de Galhos que estavam na rede de média Tensão da Ed. Física	Podas de Árvores	Gragoatá	Área Externa	
215	20/01/2021	Retirada de Gramas e Galhos no Campus do Gragoatá	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	Área Externa	
216	22/02/2021	Reforço da parte da Cerca entre os fundos da Educação Física e área Pública da Prefeitura	Aux. de Jardinagem	Gragoatá	GR - Educação Física	

DMBM - SERVIÇOS EXTINTORES - NITERÓI

217	01/02/2021	Recolha de extintores de incêndio Almoarifado Central/CASIC/CRASI	Extintores	Mequinho	Geral	-
218	01/02/2021	Recolha de extintores de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	Arquivo	-
219	01/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	Enfermagem	-
220	05/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	Veterinária	-



221	05/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	HUVET	
222	10/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio Petrópolis	Extintores	Petrópolis	PT - Esc. de Engenharia	-
223	11/02/2021	Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Serviço Social	-
224	11/02/2021	Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Economia	-
225	11/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Matemática e estatística	-
226	11/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Gragoatá	GR - Turismo e Hotelaria	-
227	19/02/2021	Devolução de extintores de incêndio Almoarifado Central/CASIC/CRASI	Extintores	Mequinho	Geral	-

228	19/02/2021	Devolução de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	Enfermagem	
229	24/02/2021	Recolha de extintores e mangueiras de incêndio	Extintores	Unidades Dispersas	HUVET	-
230	24/02/2021	Recolha de extintores de incêndio - IACS I e II	Extintores	Unidades Dispersas	IACS	-
DMBM - SERVIÇOS RESERVATÓRIOS - NITERÓI						
231	13/02/2021	Limpeza da caixa d'água do Restaurante Universitário no Gragoatá	Reservatórios	Gragoatá	GR - Restaurante	
232	22/02/2021	Limpeza da caixa d'água (1º andar) Moradia Estudantil	Reservatórios	Gragoatá	GR - Moradia Estudantil	
233	24/02/2021	Limpeza da Cisterna do Inst. de Letras Bl. B	Reservatórios	Gragoatá	GR - Letras	



234

26/02/2021

Limpeza da Cisterna e caixa d'água do NAL

Reservatórios

Valonguinho

VL - NAL

DMBM - SERVIÇOS EXECUTADOS - INTERIOR

Nº	PERÍODO	ASSUNTO	DISCIPLINA	CAMPUS	UNIDADE	CONCLUÍDO?
235	09, 10 e 11/02/2021	Roçada nos campus na Fazenda de Iguaba	Aux. de Jardinagem	Iguaba	Fazenda Escola	
236	09, 10 e 11/02/2021	Feito nova Cerca em arame farpado na Fazenda de Iguaba	Aux. de Almoxarifado	Iguaba	Fazenda Escola	
237	09, 10 e 11/02/2021	Pintura das Cercas em arame farpado na Fazenda de Iguaba	Aux. de Almoxarifado	Iguaba	PT - Esc. de Engenharia	
238	11/02/2021	Entrega de materiais para Clínica de Odontologia em Nova Friburgo	Aux. de Almoxarifado	Nova Friburgo	N.F - ISNF	

2. Coordenação de Transporte, Segurança e Logística – CTSL/SOMA

2.1 Divisão de Transporte – DTR

2.1.1 Solicitações de Transporte e Logística executadas

- ✓ Suporte logístico às ações do Restaurante Universitário na distribuição de alimentos para as Moradias Estudantis;
- ✓ Apoio Logístico aos Almojarifados;
- ✓ Suporte as ações da PROAES na entrega de Chromebooks nas unidades UFF (Niterói e Interior);
- ✓ Apoio na condução de equipe para instalação de cerca em Iguaba Grande (NEIG);
- ✓ Apoio ao Mazzini Bueno na busca e entrega de medicação;
- ✓ Apoio logístico ao Instituto de Química para produção de nitrogênio líquido junto ao CRIOUFF;
- ✓ Apoio na condução de servidores em trabalho presencial de maneira excepcional em vista do combate à pandemia do COVID-19;
- ✓ Suporte às ações do Hospital Universitário Antônio Pedro no transporte de vacinas ao Campus do Gragoatá;
- ✓ Suporte às ações da CAP/SAEP na movimentação de bens;
- ✓ Suporte às ações do STI;
- ✓ Organização do galpão de veículos e sucatas para início do processo de leilão;
- ✓ Apoio logístico ao HUAP com o transporte de Nitrogênio Líquido;
- ✓ Suporte às ações da DCF com o uso do Sistema TaxiGov;
- ✓ Apoio logístico ao Gabinete do Reitor;
- ✓ Manutenção geral e contínua das Viaturas;

2.1.1.1 Atendimento da Divisão de Transporte

Atendimentos de Transporte	
Fevereiro 2021	
Transporte	
Administrativo	43
Entrega de Bens	27
Transporte de Equipe de Apoio	14
Movimentações Internas da DTR (<i>Oficinas, Movimentações, Testes</i>)	26
Total	110

2.1.2 Registros Fotográficos da Divisão de Transporte

	
<p>Suporte as ações da PROAS na entrega de chomebooks nas unidades UFF (Niterói e Interior)</p>	<p>Apoio logístico ao HUAP com o transporte de Nitrogênio Líquido</p>
	
<p>Manutenções nas viaturas</p>	<p>Limpeza e higienização dos veículos</p>

2.2 Divisão de Segurança e Logística - DSL/CTSL

2.2.1 Principais ações

- ✓ Autorização de entrada de pessoas nos campi;
- ✓ Controle de acesso de pessoas e veículos nos campi;
- ✓ Apoio de porteiros e zeladores para serviços de manutenção programada de elevadores;
- ✓ Informações de intercorrências nos prédios, tais como: luzes acesas, portas e janelas abertas, falha nos alarmes, ar-condicionado ligados, entre outros;

2.2.2 Quantitativo de postos de vigilantes por região

Rótulos de Linha	ARMADO	DESARMADO	TOTAL
INTERIOR	24	14	38
NITERÓI	44	14	58
TOTAL	68	28	96

2.2.3 Quantitativo de postos de vigilantes por função

PREVISTO X REAL					
Contagem de CONDIÇÃO	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	ARMADO	DESARMADO	TOTAL	PREVISTO	SALDO
VIGILANTE NOTURNO 12X36	23	23	46	54	8
SUPERVISÃO DIURNO 12X36		2	2	2	0
SUPERVISÃO NOTURNO 12X36		2	2	2	0
VIGILANTE DIURNO 12x36	22		22	22	0
VIGILANTE MOTO DIURNO 12X36	12		12	12	0
VIGILANTE MOTO NOTURNO 12X36	11	1	12	12	0
TOTAL	68	28	96	104	8

2.2.4 Quantitativo de postos de vigilantes por campi

Rótulos de Linha	QUANTIDADE
ANGRA DOS REIS - IEAR	2
ANGRA DOS REIS - RETIRO	2
CAMPOS - CENTRO	4
CAMPOS - XV NOVOEMBRO	4
FAC. DIREITO	2
FAC. ENFERMAGEM	2
FAC. FARMÁCIA	2
FAC. VETERINÁRIA	2
FAZENDA ESCOLA VET.	4
GRAGOATÁ	14
IACS	4
IGUABA GRANDE	4
MACAÉ	4
MEQUINHO	4
PETRÓPOLIS	2
PRAIA VERMELHA	12
REITORIA	4
RIO DAS OSTRAS	4
STO ANTONIO DE PADUA	2
VALONGUINHO	12
VOLTA REDONDA	2
VOLTA REDONDA - ATERRADO	4
Total Geral	96
